Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 18/25/11

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „***Dodatok***“)

uzavretý medzi:

Obec:	**Mesto Senec**
IČO:	00 305 065
Sídlo organizácie:	Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec
Štatutár:	Ing. Pavol Kvál, primátor
DIČ:	2020662237
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK30 0900 0000 0050 2432 3886
Kontaktná osoba:	Karol Czere, vedúci útvaru výstavby a ochrany ŽP, kontakt: 0903 219 630, czerek@senec.sk

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	**STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.**
IČO:	53 340 671
Sídlo (miesto podnikania):	Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutár:	Ing. Martin Volčko – konateľ Ing. Vladimíra Urbanová - konateľ
DIČ:	2121451299
IČ DPH:	SK2121451299
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s
IBAN:	SK77 1100 0000 0029 4208 1480
Zapísaný v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: „Sro“ vložka č. 157173/B

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia a predmet Dodatku

1. Mesto Senec ako objednávateľ a STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.08.2025 Zmluvu o dielo č. 18/25/11 (ďalej aj ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je vykonať dielo: „*Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec*“ (ďalej aj ako „**Dielo**“).

2. Počas realizácie Diela došlo k potrebe jeho zmeny, ktorá spočíva v zmene:

a) dodávky a montáže pôvodne projektovaných výťahov značky Schindler ako súčasti Diela, nakoľko pôvodne projektovaný typ výťahu **nie je** už v čase realizácie Diela na trhu a v skladoch dostupný. Zmluvné strany sa dohodli použiť výťahy značky TREVA, keďže ide o technicky ekvivalentné riešenie, ktoré je v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zároveň spĺňa všetky relevantné technické normy a predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, čím sa v podstate jedná iba o ekvivalentnú náhradu/zámenu už nevyrábaného modelu výťahu (ďalej aj ako „**Zmena výťahov**“),

b) dispozície a dopravného riešenia parkovacích miest (ďalej aj ako „**Zmena organizácie dopravy**“) oproti tomu, ktoré je uvedené v pôvodnej projektovej dokumentácií v dôsledku zosúladenia pôvodného riešenia s platnými technickými normami upravujúcimi parametre parkovacích státí, manévrovacie priestory a dopravno-obslužné napojenia, pričom uvedené nemá vplyv na cenu Diela,

c) zmene pôvodného harmonogramu realizácie prác, ktorý tvorí prílohu **č. 2** Zmluvy jeho nahradením aktualizovaným harmonogramom realizácie prác (ďalej aj ako „**Zmena harmonogramu**“), pričom zmena bola vyvolaná reálnym priebehom zhotovovania Diela s prihliadnutím na prevádzkové, atmosférické a iné vplyvy, ktoré podmienilo takúto zmenu.

(Zmena výťahov, Zmena organizácie dopravy a Zmena harmonogramu spoločnej ďalej aj ako „**Zmeny**“).

Zmeny preto vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ ako ani Zhotoviteľ nemohli v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom touto Zmenou sa podstatne **nemení** charakter a obsah Zmluvy, ako ani **nedochádza k zmene 24-mesačnej lehote výstavby Diela ako ani k zmene v Cene Diela**.

3. Zmluvné strany dospeli vo vzťahu k Zmene výťahov k vzájomnej dohode, ktorá je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia technická špecifikácia a opis Zmeny výťahov je obsiahnutá v prílohách č. 1a až 6 tohto Dodatku.

4. Zmluvné strany dospeli vo vzťahu k Zmene organizácie dopravy k vzájomnej dohode, ktorá je v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia technická špecifikácia a opis Zmeny organizácie dopravy je obsiahnutá v prílohách č. 7 až 11 tohto Dodatku.

5. Zmluvné strany dospeli vo vzťahu k Zmene harmonogramu k vzájomnej dohode, ktorá je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia technická špecifikácia a opis Zmeny organizácie dopravy a Zmeny harmonogramu sú obsiahnuté v prílohách č. 12 až 14 tohto Dodatku.

6. **Na základe vyššie uvedeného** preto zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve predmetom ktorého je Zmena Diela ako je uvedená v bodoch 1 a 2 vyššie tohto článku I Zmluvy

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je vo vzťahu k:

a) Zmene výťahov:
- Príloha č. 1a - Návrh na schválenie zmeny technického riešenia – výťahy
- Príloha č 1b - Žiadosť o vydanie stanoviska - výťahy,
- Príloha č. 2 – Porovnanie parametrov modelov výťahov
- Príloha č. 3 - Vyhlásenie dodávateľa výťahov SCHINDLER o ukončení výroby modelu 5500,
- Príloha č. 4 - Vyhlásenie dodávateľa výťahov TREVA o splnení technických kritérií výťahov,

- Príloha č. 5 - Vyhlásenie výrobcu výťahov SCHINDLER s porovnaním modelu Schindler 5500 s novým modelom Schindler 6000,
- Príloha č. 6 – Stanovisko technického dozoru investora - výťahy,

b) Zmene organizácie dopravy:
- Príloha č. 7 - Predloženie Ponuky na zmenu č. 3
- Príloha č. 8 - Cenová kalkulácia prác
- Príloha č. 9 - Projektová dokumentácia
- Príloha č. 10 - Vyjadrenie hlavného inžiniera projektu
- Príloha č. 11 – Stanovisko technického dozoru investora - TDZ

c) Zmene harmonogramu:
- Príloha č. 12 – Sprievodný list k aktualizovanému Harmonogramu realizácie diela
- Príloha č. 13 – Aktualizovaný Harmonogram realizácie Diela
- Príloha č. 14 – Stanovisko technického dozoru investora - harmonogram

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), ako povinná osoba, tento Dodatok zverejní, pričom tento Dodatok môže byť predmetom povinnosti sprístupnenia jej obsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z..

4. Tento Dodatok je vyhotovený v **troch** rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží **dve** vyhotovenia a Zhotoviteľ **jedno** vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Senci, dňa 5. 10. 2026

Za **Objednávateľa:**

PODPÍSANÉ

.....
Mesto Senec
Pavol Kvál, primátor

V Bratislave, dňa 28. 09. 2026

Za **Zhotoviteľa:**

PODPÍSANÉ

.....
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Ing. Martin Volčko
konateľ

PODPÍSANÉ

.....
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Ing. Vladimíra Urbanová
konateľ

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava/Slovensko

Označenie listu:	**L0006/BG/2026**
Stavba:	„Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec“ (ďalej len „**Stavba**“ alebo „**Dielo**“);
Zmluva:	Zmluva o dielo č. 18/25/11 zo dňa 18.08.2025, s dátumom zverejnenia zo dňa 11.09.2025 a dátumom účinnosti zo dňa 12.09.2025; ID zmluvy: 11290439**;** URL**:** https://www.crz.gov.sk/zmluva/11290439/?csrt=16839762818636380905 (ďalej len „**Zmluva**“);
Objednávateľ	Mesto Senec Mierové nám.8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 (ďalej len „**Objednávateľ**“);
Zhotoviteľ	STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.; so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 340 671(ďalej len „**Zhotoviteľ**“);
Súvisiace články Zmluvy:	II, IV, VII, IX, XII, XVII;
Adresované:	Objednávateľovi a Technickému dozoru.

Dátum: 31.03.2026

Vec: **Návrh na schválenie zmeny technického riešenia – výťahy**

Vážený obchodný partner,

v nadväznosti na plnenie Zmluvy o dielo si Vám týmto Zhotoviteľ dovoľuje predložiť návrh na schválenie zmeny technického riešenia spočívajúci v zámene pôvodne projektovaných výťahov značky SCHINDLER za výťahy značky TREVA.

Predmet návrhu

Navrhovaná zmena sa týka dodávky a montáže výťahov ako súčasti Diela v zmysle čl. II Zmluvy. Zhotoviteľ navrhuje použiť výťahy značky TREVA, pričom:

- ide o **technicky ekvivalentné alebo kvalitatívne vyššie riešenie**,
- sú plne v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),
- spĺňajú všetky relevantné technické normy a predpisy platné na území Slovenskej republiky.

Súlad so Zmluvou a zadávacou dokumentáciou

Navrhovaná zmena je v súlade so Zmluvou, najmä:

- požiadavkou na splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov bez väzby na konkrétne obchodné označenie výrobku,
- povinnosťou realizovať Dielo s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými technickými normami,
- podmienkami projektovej dokumentácie a zadávacej dokumentácie.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Zhotoviteľ zároveň deklaruje, že navrhovaná zmena:

- nemení rozsah Diela,
- nemá vplyv na cenu Diela,
- nepredstavuje práce naviac,
- nemá negatívny vplyv na harmonogram realizácie.

Technické a kvalitatívne parametre

Navrhované výťahy TREVA:

- dosahujú **rovnaké alebo vyššie technické parametre** oproti pôvodne navrhovaným výťahom značky Schindler,
- sú plne kompatibilné s projektovaným stavebným riešením,
- spĺňajú požiadavky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zdravotníckeho zariadenia,
- budú dodané vrátane všetkých požadovaných dokladov pre riadne odovzdanie a kolaudáciu Diela.

Vyhlásenie výrobcov / dodávateľov

V predmetnom vyhlásení spoločnosť SCHINDLER:

- prehlasuje, že model výťahu Schindler 5500 už nie je zaradený vo výrobnom programe a bol nahradený novým modelom s označením Schindler 6000, pričom sa jedná o upgrade a modernizáciu modelu zohľadňujúcu legislatívne predpisy a požiadavky trhu

Súčasťou tohto návrhu je aj Vyhlásenie o splnení technických kritérií výťahov vydané spoločnosťou TREVA, ktoré tvorí prílohu tohto listu.
V predmetnom vyhlásení spoločnosť TREVA:

- vykonala porovnanie technických parametrov pôvodne navrhovaných výťahov SCHINDLER, a to modelu 5500, ktorý už nieje vo výrobnnom programe a zároveň aj aktuálneho modelu 6000
- navrhla z vlastného produktového portfólia ekvivalentné, resp. technicky výkonnejšie riešenia,
- potvrdzuje splnenie všetkých požadovaných technických a kvalitatívnych kritérií v zmysle projektovej dokumentácie.

Servis

Nakoľko je v objekte existujúcej polikliniky SO102 objednaný a bude dodávaný výťah spoločnosťou TREVA, čo sa týka servisu ide o účelné a hospodárne riešenie, zabezpečujúce kontinuitu dodávky, montáže a následného servisu zariadení.

Záruky a dokumentácia

Zhotoviteľ zabezpečí, že dodané zariadenia budú spĺňať všetky požiadavky na:

- kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť,
- dodanie kompletných certifikátov, atestov a revíznych správ,
- odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne užívanie a kolaudáciu Diela.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Návrh ďalšieho postupu

Za účelom zachovania plynulosti realizácie Diela si Vás dovoľujeme požiadať o:

- **písomné schválenie navrhovanej zmeny**,
- prípadne jej prerokovanie na najbližšom kontrolnom dni stavby.

Záver

Navrhované riešenie predstavuje plnohodnotnú technickú alternatívu bez dopadu na cenu, rozsah ani kvalitu Diela, pri zachovaní všetkých zmluvných a technických požiadaviek.
V prípade potreby sme pripravení bezodkladne predložiť doplňujúce technické podklady

Prílohy:

1. Vyhlásenie dodávateľa výťahov TREVA o splnení technických kritérií výťahov
2. Vyhlásenie dodávateľa výťahov SCHINDLER o ukončení výroby modelu 5500

S pozdr[redacted]

.....

Ing. Andre

hlavný stav

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava/Slovensko

Označenie listu:	**L0029/BG/2026**
Stavba:	„Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec" (ďalej len „**Stavba**" alebo „**Dielo**");
Zmluva:	Zmluva o dielo č. 18/25/11 zo dňa 18.08.2025, s dátumom zverejnenia zo dňa 11.09.2025 a dátumom účinnosti zo dňa 12.09.2025; ID zmluvy: 11290439; URL: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11290439/?csrt=16839762818636380905 (ďalej len „**Zmluva**");
Objednávateľ	Mesto Senec Mierové nám.8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 (ďalej len „**Objednávateľ**");
Zhotoviteľ	STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.; so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 340 671(ďalej len „**Zhotoviteľ**");
Súvisiace články Zmluvy:	II, IV, VII, IX, XII, XVII;
Adresované:	Objednávateľovi a Technickému dozoru.

Dátum: 23.07.2026

Vec: **Žiadosť o vydanie stanoviska – výťahy**

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že výťah **Schindler 5500** sa nevyrába a je nahradený novým modelom **Schindler 6000, ktorý Vám ponúkame s doplatkom +15% za kus**, keďže ide o technologicky vyšší model predstavujúci upgrade zazmluvneného typu Schidnler 5500. V prípade voľby tohto modelu bude potrebné v rámci realizačnej projektovej dokumentácie doriešiť v časti elektroinštalácie spôsob využitia rekuperovanej elektrickej energie v režime požiaru, keďže výťah je vybavený **rekuperačným frekvenčným meničom.**

Zároveň Vám ponúkame ekvivalentné riešenie od spoločnosti **Treva, ktoré spĺňa všetky požadované parametre bez navýšenia zmluvnej ceny.**

Týmto Vás žiadame o vydanie písomného stanoviska, ktorým určíte preferovaný variant riešenia.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Prílohy:

1. Vyhlásenie dodávateľa výťahov TRE[redacted]kých kritérií výťahov
2. Porovnanie parametrov

S[redacted]

.....

Ing. Andrej Kollár
hlavný stavbyvedúci
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

TREVA
STÚPAJTE S NAMI

Príloha č.1

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Direkcia TT, Oblasť BG, Slovensko
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava/Slovensko

Vyhlásenie o splnení technických kritérií výťahov

Spoločnosť TREVA, s.r.o. týmto vyhlasuje, že nami dodávané a realizované výťahy pre projekt Poliklinika Senec spĺňajú všetky požadované technické, bezpečnostné a prevádzkové kritériá definované pre kategórie výťahov V1, V2 a V3.

Zároveň potvrdzujeme, že naše riešenia sú plnohodnotnou alternatívou k referenčným výťahom:

- typ V1 a V2 – Schindler 5500,
- typ V3 – Schindler 3000

Výťahy dodávané spoločnosťou TREVA, s.r.o. dosahujú rovnaké alebo vyššie technické parametre, najmä z hľadiska:

- nosnosti a kapacity,
- rýchlosti a plynulosti prevádzky,
- energetickej efektívnosti,
- bezpečnostných štandardov,
- komfortu pre používateľov,
- spoľahlivosti a životnosti zariadení.

Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu výťahov na mieru, pričom každé riešenie je prispôsobené konkrétnym požiadavkám projektu a investora. Vďaka tomu vieme flexibilne reagovať na technické špecifikácie a zabezpečiť plnohodnotnú náhradu za uvedené referenčné typy výťahov.
Týmto vyhlasujeme, že výťahy od spoločnosti TREVA, s.r.o. sú vhodné pre použitie v objekte Poliklinika Senec a spĺňajú všetky požiadavky kladené na kategórie V1, V2 a V3.
V prípade potreby vieme doložiť podrobné technické špecifikácie, výkresovú dokumentáciu a referencie realizovaných projektov.

Nakoľko bol v objekte existujúcej polikliniky objednaný a dodávaný výťah spoločnosťou TREVA, s.r.o., zabezpečenie servisu výťahov touto spoločnosťou považujeme za účelné a hospodárne riešenie, zabezpečujúce kontinuitu dodávky, montáže a následného servisu zariadení.

Parametre výťahov:

Parameter	Navrhovaný model TREVA V1,V2 Premium 1600	Navrhovaný model TREVA V3 Premium 1000
Nosnosť/počet osôb	1600kg/21	1000kg/13
Zdvih	13.6 m	4 m
Rýchlosť	1 m/s	1 m/s
Riadenie	KS	KA
Stavebné tolerancie	+- 25 mm	+- 20 mm
Hmotnosť klietky/kabíny GK	1380 kg	960 kg
Celková hmotnosť GKU	Cca 3860 kg	Cca3000 kg
Nominálne napätie	400 V	400 V
Napájanie osvetlenia	230V AC	230V AC
Hlavná frekvencia	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%
Typ a veľkosť hlavného ističa v rozvádzači	C40A	C16A
Max. prípustný prierez	25 mm²	25 mm²
Nominálny prúd zariadenia INN	29,00 A	12,89 A
Záberový prúd zariadenia INA	32,10 A	14,30 A

V [redacted] .3.2026

[redacted]

TREVA, s.r.o.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Direkcia TT
Oblasť BG

Porovnanie parametrov výťahov:

Parameter	Zmluvný model (nevyrába sa)	Zmluvný model	Navrhovaný model	Navrhovaný model
	Schindler V1, V2 5500	**Schindler V3 3000**	**TREVA V1,V2 Premium 1600**	**TREVA V3 Premium 1000**
Nosnosť/počet osôb	1600kg/21	1000kg/13	1600kg/21	1000kg/13
Zdvih	13.6 m	4 m	13.6 m	4 m
Rýchlosť	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Riadenie	KS	KA	KS	KA
Stavebné tolerancie	+- 25 mm	+- 20 mm	+- 25 mm	+- 20 mm
Hmotnosť klietky/kabíny GK	1228 kg	652 kg	1380 kg	960 kg
Celková hmotnosť GKU	2834 kg	1654 kg	cca 3860 kg	cca 3000 kg
Nominálne napätie	400 V	400 V	400 V	400 V
Napájanie osvetlenia	220 V	230 V	230V AC	230V AC
Hlavná frekvencia	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%
Typ a veľkosť hlavného ističa v rozvádzači	C40A	C16A	C40A	C16A
Max. prípustný prierez	25 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	25 mm^2
Nominálny prúd zariadenia INN	29,00 A	12,89 A	29,00 A	12,89 A
Záberový prúd zariadenia INA	32,10 A	14,30 A	32,10 A	14,30 A

TREVA
STÚPAJTE S NAMI

Parametre výťahov:

Parameter	Zmluvný model (nevyrába sa)	Ekvivalentný model	Zmluvný model	Navrhovaný model	Navrhovaný model
	Schindler V1, V2 5500	**Schindler V1, V2 6000**	**Schindler V3 3000**	**TREVA V1,V2 Premium 1600**	**TREVA V3 Premium 1000**
Nosnosť/počet osôb	1600kg/21	1600kg/21	1000kg/13	1600kg/21	1000kg/13
Rýchlosť	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Zdvih	13.6 m	10.42 m	4 m	13.6 m	4 m
Požiarna odolnosť šachtových dverí	EI60	EI60	EW60	EI60	EW60
Riadenie	KS	KS	KA	KS	KA
Stavebné tolerancie	+- 25 mm	+- 25 mm	+- 20 mm	+- 25 mm	+- 20 mm
Celková hmotnosť GKU	2834 kg	cca 2750 kg	1654 kg	Cca 2980 kg	cca1800 kg
Nominálne napätie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Napájanie osvetlenia	220 V	230 V	230 V	230V AC	230V AC
Hlavná frekvencia	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%
Typ a veľkosť hlavného ističa v rozvádzači	C40A	C40A	C16A	C40A	C16A
Max. prípustný prierez	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2
Nominálny prúd zariadenia INN	29,00 A	29,00 A	12,89 A	29,00 A	12,89 A
Záberový prúd zariadenia INA	32,10 A	32,10 A	14,30 A	32,10 A	14,30 A
Menovitý výkon motora	cca 11 kW	11.4 kW	7,8 kW	12 kW	7,5 kW
Počet jázd za hodinu	180	180	120	180	180

V Bratislave , dňa 25.3.2026

.....

TREVA, s.r.o.

[redacted]

TREVA s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava
vytahy@trevavytahy.sk
02/ 638 14 058, 0907 725 300
www.trevavytahy.sk

TREVA
STÚPAJTE S NAMI

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Direkcia TT, Oblasť BG, Slovensko
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava/Slovensko

Vyhlásenie o splnení technických kritérií výťahov

Spoločnosť TREVA, s.r.o. týmto vyhlasuje, že nami dodávané a realizované výťahy pre projekt Poliklinika Senec spĺňajú všetky požadované technické, bezpečnostné a prevádzkové kritériá definované pre kategórie výťahov V1, V2 a V3.

Zároveň potvrdzujeme, že naše riešenia sú plnohodnotnou alternatívou k referenčným výťahom:

- typ V1 a V2 – Schindler 5500, resp. Schindler 6000,
- typ V3 – Schindler 3000

Výťahy dodávané spoločnosťou TREVA, s.r.o. dosahujú rovnaké alebo vyššie technické parametre, najmä z hľadiska:

- nosnosti a kapacity,
- rýchlosti a plynulosti prevádzky,
- energetickej efektívnosti,
- bezpečnostných štandardov,
- komfortu pre používateľov,
- spoľahlivosti a životnosti zariadení.

Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu výťahov na mieru, pričom každé riešenie je prispôsobené konkrétnym požiadavkám projektu a investora. Vďaka tomu vieme flexibilne reagovať na technické špecifikácie a zabezpečiť plnohodnotnú náhradu za uvedené referenčné typy výťahov.
Týmto vyhlasujeme, že výťahy od spoločnosti TREVA, s.r.o. sú vhodné pre použitie v objekte Poliklinika Senec a spĺňajú všetky požiadavky kladené na kategórie V1, V2 a V3.
V prípade potreby vieme doložiť podrobné technické špecifikácie, výkresovú dokumentáciu a referencie realizovaných projektov.

Nakoľko bol v objekte existujúcej polikliniky objednaný a dodávaný výťah spoločnosťou TREVA, s.r.o., zabezpečenie servisu výťahov touto spoločnosťou považujeme za účelné a hospodárne riešenie, zabezpečujúce kontinuitu dodávky, montáže a následného servisu zariadení.

From: Peter Viazanko <peter.viazanko@schindler.com>
Sent: Wednesday, April 1, 2026 4:00 PM
To: Ivana Vodova <ivana.vodova@strabag.com>
Subject: [EXTERNAL] RE: [EXTERNAL] prehlásenie

Dobrý deň pani Vodová,

Potvrdzujem písomne, že model S5500 už nie je vo výrobnom programe našej spoločnosti, podľa technických parametrov, nosnosti a podobne ho nahradilo nové označenie Schindler 6000. Je to upgrade a modernizácia modelu S5500 zohľadňujúc legislatívne predpisy a požiadavky trhu. Drvivá väčšina dielov je totožná, nie je to nejaký odlišný, menejcenný model, ktorý by ho nahrádzal či zamenil. Ide hlavne o typové označenie oddeľujúce možnosti S5500 a S6000.

S pozdravom,

Peter Viazanko | Salesman NI
Mobile +421903221995
peter.viazanko@schindler.com
www.schindler.sk

TREVA
STÚPAJTE S NAMI

Parametre výťahov:

Parameter	Zmluvný model (nevyrába sa)	Ekvivalentný model	Zmluvný model	Navrhovaný model	Navrhovaný model
	Schindler V1, V2 5500	**Schindler V1, V2 6000**	**Schindler V3 3000**	**TREVA V1,V2 Premium 1600**	**TREVA V3 Premium 1000**
Nosnosť/počet osôb	1600kg/21	1600kg/21	1000kg/13	1600kg/21	1000kg/13
Rýchlosť	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Zdvih	13.6 m	10.42 m	4 m	13.6 m	4 m
Požiarna odolnosť šachtových dverí	EI60	EI60	EW60	EI60	EW60
Riadenie	KS	KS	KA	KS	KA
Stavebné tolerancie	+- 25 mm	+- 25 mm	+- 20 mm	+- 25 mm	+- 20 mm
Celková hmotnosť GKU	2834 kg	cca 2750 kg	1654 kg	Cca 2980 kg	cca1800 kg
Nominálne napätie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Napájanie osvetlenia	220 V	230 V	230 V	230V AC	230V AC
Hlavná frekvencia	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%	50 Hz +/- 5%
Typ a veľkosť hlavného ističa v rozvádzači	C40A	C40A	C16A	C40A	C16A
Max. prípustný prierez	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2
Nominálny prúd zariadenia INN	29,00 A	29,00 A	12,89 A	29,00 A	12,89 A
Záberový prúd zariadenia INA	32,10 A	32,10 A	14,30 A	32,10 A	14,30 A
Menovitý výkon motora	cca 11 kW	11.4 kW	7,8 kW	12 kW	7,5 kW
Počet jázd za hodinu	180	180	120	180	180

V Bratislave , dňa 25.3.2026

.....

TREVA, s.r.o.

[redacted]

TREVA s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava
vytahy@trevavytahy.sk
02/ 638 14 058, 0907 725 300
www.trevavytahy.sk

TREVA
STÚPAJTE S NAMI

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Direkcia TT, Oblasť BG, Slovensko
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava/Slovensko

Vyhlásenie o splnení technických kritérií výťahov

Spoločnosť TREVA, s.r.o. týmto vyhlasuje, že nami dodávané a realizované výťahy pre projekt Poliklinika Senec spĺňajú všetky požadované technické, bezpečnostné a prevádzkové kritériá definované pre kategórie výťahov V1, V2 a V3.

Zároveň potvrdzujeme, že naše riešenia sú plnohodnotnou alternatívou k referenčným výťahom:

- typ V1 a V2 – Schindler 5500, resp. Schindler 6000,
- typ V3 – Schindler 3000

Výťahy dodávané spoločnosťou TREVA, s.r.o. dosahujú rovnaké alebo vyššie technické parametre, najmä z hľadiska:

- nosnosti a kapacity,
- rýchlosti a plynulosti prevádzky,
- energetickej efektívnosti,
- bezpečnostných štandardov,
- komfortu pre používateľov,
- spoľahlivosti a životnosti zariadení.

Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu výťahov na mieru, pričom každé riešenie je prispôsobené konkrétnym požiadavkám projektu a investora. Vďaka tomu vieme flexibilne reagovať na technické špecifikácie a zabezpečiť plnohodnotnú náhradu za uvedené referenčné typy výťahov.
Týmto vyhlasujeme, že výťahy od spoločnosti TREVA, s.r.o. sú vhodné pre použitie v objekte Poliklinika Senec a spĺňajú všetky požiadavky kladené na kategórie V1, V2 a V3.
V prípade potreby vieme doložiť podrobné technické špecifikácie, výkresovú dokumentáciu a referencie realizovaných projektov.

Nakoľko bol v objekte existujúcej polikliniky objednaný a dodávaný výťah spoločnosťou TREVA, s.r.o., zabezpečenie servisu výťahov touto spoločnosťou považujeme za účelné a hospodárne riešenie, zabezpečujúce kontinuitu dodávky, montáže a následného servisu zariadení.

Porovnanie technických a funkčných parametrov výťahov Schindler 5500 a Schindler 6000

	údaje uvedené v TL na stranách č. 2,11	*údaje uvedené v TL na stranách č. 9,10,16,17,18,28,30,34,35,36,58*
	Schindler 5500	**Schindler 6000**
Max. zdvih	107 m	150 m
Max. počet zastávok	33	50
Max. počet otvorov	45	80
Max. rýchlosť	max do 2,5 m/s	max do 3,0 m/s
Výška kabíny	max. 3048 mm	max. 3200 mm
Šírka dverí	max. cca 1370 mm	až 1800 mm
Digitálna konektivita	Schindler Ahead (4G)	Natívne digitálne riešenie novej generácie
Smart aplikácie	základné Ahead	ElevateMe, ActionBoard, SmartMirror, MediaScreen, Cube
Bluetooth	nie je štandardne zdôraznené	integrované vo fixture riešeniach
Mobilné privolanie výťahu	nie	Áno (QR kód / Bluetooth)
Digitálny adresár	nie	Áno
Infotainment displeje	obmedzené	Primea 500, Linea 300
Správa budovy online	základné monitorovanie	ActionBoard s rozšírenou správou
Prevádzkové dáta	základné	monitoring energie, údržby a stavu zariadenia

Záver:

Schindler 5500
kvalitný výťah strednej triedy, vhodný pre štandardné bytové a kancelárske budovy.

Schindler 6000
prémiový produkt novej generácie, vyšší výkon, vyššia kapacita a väčší rozsah použitia, výrazne modernejšie ovládanie, infotainment a digitálne služby pre nájomcov, pripravený na smart building riešenia.

Schindler 6000 nie je náhradou za Schindler 5500 v rovnakom segmente. Ide o produkt vyššej generácie určený pre prémiové rezidenčné, administratívne a mixed-use projekty. Okrem vyšších technických parametrov prináša digitálny ekosystém, infotainment riešenia, mobilné ovládanie, pokročilú správu budovy, vyššiu energetickú efektívnosť a rozšírené možnosti dizajnu.

RealLife

Real Life, s.r.o. Na Pažiti 835/1, 911 05 Trenčín

Mesto Senec
Mierové Námestie č. 8
903 01 Senec

Vec: Stanovisko TDI k Ponuke na zmenu – Stavba: „Zámena výťahov – objekt polikliniky“

Vážený investor,
ako technický dozor investora som posúdil požiadavku zhotoviteľa na zámenu typu výťahov v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec“. K navrhovanej zmene predkladám nasledovné stanovisko aktualizované stanovisko k dnešnému dňu 23. 07. 2026:

1. Zdôvodnenie zmeny
   Zhotoviteľ predložil oficiálne potvrdenie výrobcu Schindler, že pôvodne projektovaný typ výťahu (Schindler 5500) sa už nevyrába. Zhotoviteľ zároveň uviedol, že výrobca Schindler ponúka ako náhradu len nový, technologicky vyšší model Schindler 6000, avšak s doplatkom +15 % za kus. Z tohto dôvodu zhotoviteľ predložil ako finančne aj technicky vhodnú alternatívu riešenie od spoločnosti TREVA s.r.o.

2. Technické posúdenie náhrady
   Navrhovaným náhradným riešením je inštalácia výťahov od spoločnosti TREVA s.r.o, :Model: TREVA Premium 1600 a TREVA Premium 1000.
   Na základe predloženého prehlásenia spoločnosti Treva potvrdzujem, že navrhované výťahy:
   - spĺňajú všetky technické parametre požadované v pôvodnej projektovej dokumentácii,
   - sú plne kompatibilné s existujúcou šachtou a stavebnou pripravenosťou objektu,
   - zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným a kvalitatívnym normám.
3. Vplyv na cenu a harmonogram:
   - Navrhovaná zámena nemá vplyv na zmluvnú cenu diela. Zhotoviteľ garantuje dodržanie rozpočtových nákladov v zmysle platnej Zmluvy o dielo bez nároku na navýšenie.
   - Zmena typu výťahu nemá negatívny vplyv na celkovú lehotu výstavby. Zvolený dodávateľ deklaruje pripravenosť realizovať montáž v súlade s aktuálnym harmonogramom prác.

Záver a odporúčanie: Vzhľadom na to, že dodávateľ Schindler ponúka ako náhradu len vyšší model s cenovým navýšením (+15 %) a nevyhnutnou úpravou [redacted] systému riadenia vyhradeného technického zariadenia - výťahu schváliť predloženú adekvátnu technickú náhradu od spoločnos všetky požiadavky projektu bez nároku na navýšenie zmluvnej

.....
Tec
Ľubor Čmarko

IČO: 36798002 ▪ IČDPH: SK2022411237 ▪ DIČ: 2022411237
cmarko@reallife-tdi.sk ,
Tel: 0917 796 757

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava/Slovensko

Označenie listu:	**L0014/BG/2025**
Stavba:	„Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec“ (ďalej len „**Stavba**“ alebo „**Dielo**“);
Zmluva:	Zmluva o dielo č. 18/25/11 zo dňa 18.08.2025, s dátumom zverejnenia zo dňa 11.09.2025 a dátumom účinnosti zo dňa 12.09.2025; ID zmluvy: 11290439**;** URL**:** https://www.crz.gov.sk/zmluva/11290439/?csrt=16839762818636380905 (ďalej len „**Zmluva**“);
Objednávateľ	Mesto Senec Mierové nám.8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 (ďalej len „**Objednávateľ**“);
Zhotoviteľ	STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.; so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 340 671(ďalej len „**Zhotoviteľ“**);
Súvisiace články Zmluvy:	IV, XV, XVII;
Adresované:	Objednávateľovi a Technickému dozoru.

Dátum: 26.03.2026

Vec: **Predloženie Ponuky na zmenu č. 3**

Vážený obchodný partner,

na základe Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ týmto listom predkladá návrh na zmenu rozsahu Diela v súlade s Článkom IV bodom 4.6 Zmluvy formou „ponuky na zmenu č. 3“ (ďalej len „**Ponuka na zmenu č.3**“). Návrh vychádza z nových skutočností, ktoré boli zistené počas uskutočňovania prác na Diele. Takáto úprava a zmena rozsahu Diela sú nevyhnutné na zhotovenie technicky spôsobilého a skolaudovateľného Diela v súlade s platnými normami a právnymi predpismi.

Popis udalosti a dôvod zmeny:

V priebehu projekčných prác súvisiacich s prípravou realizačnej dokumentácie Zhotoviteľ zistil, že pôvodne navrhnuté dispozičné a dopravné riešenie parkovacích miest, ktoré vyplývalo zo Zadávacej dokumentácie predloženej Objednávateľom, nie je v plnom súlade s platnými technickými normami upravujúcimi parametre parkovacích státí, manévrovacie priestory a dopravno-obslužné napojenia.

V súlade s ustanoveniami **čl. 15.1 a 15.2 Zmluvy** je Zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie Zmluvy, a preto týmto oznámením informuje o identifikovanom nesúlade a jeho dôsledkoch.
Zároveň s prihliadnutím na **čl. 7.3 Zmluvy**, ktorý Zhotoviteľovi ukladá povinnosť zabezpečiť vykonávanie Diela pri dodržaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, technických a bezpečnostných noriem, je nevyhnutné pristúpiť k úprave dopravného riešenia s priamym dopadom na rozmiestnenie parkovacích miest, pričom celkový počet parkovacích miest ostáva zachovaný.
Keďže pôvodné riešenie bolo súčasťou Zadávacej dokumentácie Objednávateľa a nesúlad s normami nebolo možné predvídať bez podrobnej projekčnej rozpracovanosti.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Predložené nové riešenie dopravy najefektívnejším spôsobom zabezpečuje organizáciu dopravy, dostatočné kapacity parkovania a plynulý pohyb osôb smerujúcich do a z polikliniky za dodržania všetkých platných bezpečnostných predpisov.

Pre podrobnejšie preskúmanie rozsahu navrhovaných prác Zhotoviteľ v prílohe tohto listu pripája projektovú dokumentáciu k navrhovaným prácam. (viď. prílohu č. 2)

Dopad zmeny č. 3 na Harmonogram a lehotu výstavby

- **Nie, ak bude včas odsúhlasené**

Ocenenie zmeny č. 3 a jej vplyv na cenu Diela

- **Bez vplyvu na cenu**

V nadväznosti na predloženú Ponuku na zmenu č. 3 Vás týmto Zhotoviteľ žiada o jej bezodkladné schválenie, keďže ide o skutočnosť zásadného významu pre plynulé pokračovanie nadväzujúcich činností a prác a prijatie nevyhnutných technických opatrení v súlade so Zmluvou o dielo.

Zároveň Vás Zhotoviteľ žiada, aby Objednávateľ po schválení Ponuky na zmenu č. 3 poskytol potrebnú súčinnosť pri príprave a uzavretí príslušného písomného dodatku k Zmluve. Tento dodatok je nevyhnutný na formálne rozšírenie rozsahu Diela o predmetné projektové zmeny.

Zhotoviteľ upozorňuje, že podľa čl. 17.4 Zmluvy je možné Zmluvu dopĺňať alebo meniť výlučne písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami, a to len v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu Vás týmto Zhotoviteľ žiada o zaslanie potvrdenia o schválení zmeny č. 3 v čo najkratšom termíne, najneskôr však do **30.04.2026** a zároveň o uzavretie dodatku k Zmluve a to tak aby nedošlo k prerušeniu realizácie prác a k ohrozeniu Harmonogramu.

Prílohy:

1. Ponuka na zmenu č.3 - Cenová kalkulácia prác
2. Projektová dokumentácia
   výkres: HROMADNÁ GARÁŽ 1.PP – Pôvodný stav
   názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba poliklinika SENEC – SO101.3
   stupeň: DSP
   č. výkresu: 02

   výkres: Trvalé dopravné značenie na 1.PP – Nový stav
   názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba poliklinika SENEC – SO101.3
   stupeň: RPD
   č. výkresu: 002
   výkres: SITUÁCIA – Pôvodný stav
   názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba poliklinika SENEC – SO 201, SO 202
   stupeň: DSP
   č. výkresu: 2.2

   výkres: SITUÁCIA – Nový stav
   názov stavby: Rekonštrukcia a prístavba poliklinika SENEC – SO 201, SO 202
   stupeň: RP
   č. výkresu: 002
3. Vyjadrenie HIP

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

S pozdravom



.....
Ing
hlav
STRABAG P s.r.o.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: **STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.**

Dátum: 25.7.2025
Projektant: MENO s.r.o.
Spracoval:

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

Výška zmeny
0,07%

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH	Cena Podľa ZoD bez DPH	Cena bez DPH vrátane dodatku	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty	Cenový dopad
	Rek a prístavba polikliniky Senec	**8 127 642,28**	**1 869 357,72**	**9 997 000,00**	**8 127 642,28**	**8 127 642,28**	**2 942,55**	**2 942,55**	**5 885,10**	**0,00**
01	**SO 101, SO 101.1**	**5 589 368,76**	**1 285 554,81**	**6 874 923,57**	**5 589 368,76**	**5 589 368,76**				
a	SO 101 Architektúra	*3 095 764,75*	*712 025,89*	*3 807 790,64*	*3 095 764,75*	*3 095 764,75*				
b	SO 101 Architektúra kuchyňa 1.+2.np	*97 711,59*	*22 473,67*	*120 185,26*	*97 711,59*	*97 711,59*				
c	SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav	*338 317,71*	*77 813,07*	*416 130,78*	*338 317,71*	*338 317,71*				
d	SO 101, 101.1 Zdravotechnika	*252 530,97*	*58 082,12*	*310 613,09*	*252 530,97*	*252 530,97*				
e	SO 101, 101.1 Vykurovanie	*621 004,61*	*142 831,06*	*763 835,67*	*621 004,61*	*621 004,61*				
f	SO 101, 101.1 Klimatizácia	*348 802,00*	*80 224,46*	*429 026,46*	*348 802,00*	*348 802,00*				
g	SO 101, 101.1 Vetranie, odsávanie	*138 538,84*	*31 863,93*	*170 402,77*	*138 538,84*	*138 538,84*				
h	SO 101, 101.1 Hlasová signalizácia požiaru, RZP	*83 336,43*	*19 167,38*	*102 503,81*	*83 336,43*	*83 336,43*				
i	SO 101, 101.1 Elektrická požiarna signalizácia, RZP	*108 516,27*	*24 958,74*	*133 475,01*	*108 516,27*	*108 516,27*				
j	SO 101, 101.1 Elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody	*273 296,04*	*62 858,09*	*336 154,13*	*273 296,04*	*273 296,04*				
k	SO 101 Medicínske plyny	*222 080,67*	*51 078,55*	*273 159,22*	*222 080,67*	*222 080,67*				
l	SO 101 OPZ Plyn	*9 468,88*	*2 177,84*	*11 646,72*	*9 468,88*	*9 468,88*				
03	**SO 101.2 Odpadové hospodárstvo**	**25 557,44**	**5 878,21**	**31 435,65**	**25 557,44**	**25 557,44**				
04	**SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž**	**1 511 122,99**	**347 558,29**	**1 858 681,28**	**1 511 122,99**	**1 512 383,94**	**1 619,68**	**358,73**	**1 978,41**	
04a	SO 101.3 Architektúra	*1 361 911,60*	*313 239,67*	*1 675 151,27*	*1 361 911,60*	*1 363 172,55*	*1 619,68*	*358,73*	*1 978,41*	1 260,95
04b	SO 101.3 Elektroinštalácia	*79 941,92*	*18 386,64*	*98 328,56*	*79 941,92*	*79 941,92*				
04c	SO 101.3 Hlasová signalizácia požiaru	*10 527,49*	*2 421,32*	*12 948,81*	*10 527,49*	*10 527,49*				
04d	SO 101.3 Elektrická požiarna signalizácia	*18 908,14*	*4 348,87*	*23 257,01*	*18 908,14*	*18 908,14*				
04e	S0 101.3 Vetranie, odvetranie	*39 833,84*	*9 161,78*	*48 995,62*	*39 833,84*	*39 833,84*				
05	**SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**	**488 928,04**	**112 453,45**	**601 381,49**	**488 928,04**	**487 667,09**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**	-1 260,95
06	**SO 301 Splašková kanalizácia**	**22 340,65**	**5 138,35**	**27 479,00**	**22 340,65**	**22 340,65**				
07	**SO 302 Dažďová kanalizácia**	**74 019,52**	**17 024,49**	**91 044,01**	**74 019,52**	**74 019,52**				
08	**SO 303 Tuková kanalizácia**	**5 849,85**	**1 345,47**	**7 195,32**	**5 849,85**	**5 849,85**				
09	**SO 401 Vodovodná prípojka**	**27 650,19**	**6 359,54**	**34 009,73**	**27 650,19**	**27 650,19**				
10	**SO 501 Prípojka a rozvody NN**	**6 192,23**	**1 424,21**	**7 616,44**	**6 192,23**	**6 192,23**				
11	**SO 502 Prípojka VN**	**30 059,92**	**6 913,78**	**36 973,70**	**30 059,92**	**30 059,92**				
12	**SO 601 Prípojka a rozvody slaboprúd**	**2 481,57**	**570,76**	**3 052,33**	**2 481,57**	**2 481,57**				
13	**SO 701 Prípojka plynu**	**7 227,12**	**1 662,24**	**8 889,36**	**7 227,12**	**7 227,12**				
14	**SO 801 Sadové úpravy**	**49 037,20**	**11 278,56**	**60 315,76**	**49 037,20**	**49 037,20**				
15	**SO 901 Príprava územia**	**72 945,53**	**16 777,47**	**89 723,00**	**72 945,53**	**72 945,53**				
16	**Realizačný projekt stavby**	**214 861,27**	**49 418,09**	**264 279,36**	**214 861,27**	**214 861,27**				

Poznámka: V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú inform. charakter a slúžia ako minimálny štandart. Sú uvedené ako ref. kvalita a môžu byť nahradené EKVIVALENTOM výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti - ODSÚHLASIŤ S GP

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 206 396,11**			**1 206 646,18**	**608,80**	**358,73**	**967,53**
	1	**Zemné práce**				**246 178,58**			**246 178,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	131201104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 10000 m3	m3	10 970,060	2,37	25 999,04	10 970,060	2,37	25 999,04			0,00 €
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10 970,060	0,18	1 974,61	10 970,060	0,18	1 974,61			0,00 €
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50 m	m3	2 916,000	1,82	5 307,12	2 916,000	1,82	5 307,12			0,00 €
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	9 512,060	6,35	60 401,58	9 512,060	6,35	60 401,58			0,00 €
5	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 458,000	2,07	3 018,06	1 458,000	2,07	3 018,06			0,00 €
6	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	9 512,060	12,97	123 371,42	9 512,060	12,97	123 371,42			0,00 €
7	175101201	Obsyp objektov zemina	m3	1 458,000	15,21	22 176,18	1 458,000	15,21	22 176,18			0,00 €
8	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 569,000	1,53	3 930,57	2 569,000	1,53	3 930,57			0,00 €
9	460010001	Vytýčenie základov	bm	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
	2	**Zakladanie**				**354 079,61**			**354 079,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku hr. 200 mm	m3	523,520	36,50	19 108,48	523,520	36,50	19 108,48			0,00 €
11	272361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505 - orientačne	t	116,956	1 313,95	153 674,58	116,956	1 313,95	153 674,58			0,00 €
12	273313611.S	Betón základových dosiek podkladový, prostý tr.C 16/20 hr. 100 mm	m3	259,435	102,29	26 537,59	259,435	102,29	26 537,59			0,00 €
13	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1 295,691	113,58	147 164,61	1 295,691	113,58	147 164,61			0,00 €
14	273351215	Debnenie podkladových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	170,600	24,33	4 150,70	170,600	24,33	4 150,70			0,00 €
15	273351216	Debnenie podkladových dosiek, odstránenie-dielce	m2	170,600	12,17	2 076,20	170,600	12,17	2 076,20			0,00 €
16	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,822	114,45	437,43	3,822	114,45	437,43			0,00 €
17	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	25,480	24,33	619,93	25,480	24,33	619,93			0,00 €
18	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	25,480	12,17	310,09	25,480	12,17	310,09			0,00 €
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**145 092,62**			**145 092,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	310271303.S	Murivo z debn. tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	4,440	178,26	791,47	4,440	178,26	791,47			0,00 €
20	311361821.S	Výstuž DT múrov 10505 - orientačne	t	0,266	1 313,95	350,04	0,266	1 313,95	350,04			0,00 €
21	311321411.S	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	240,587	115,67	27 828,68	240,587	115,67	27 828,68			0,00 €
22	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1 669,118	24,33	40 609,65	1 669,118	24,33	40 609,65			0,00 €
23	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	1 669,118	12,17	20 313,17	1 669,118	12,17	20 313,17			0,00 €
24	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 - orientačne	t	28,870	1 313,95	37 934,29	28,870	1 313,95	37 934,29			0,00 €
25	317121151	Montáž prekladu svetl. otvoru do 1050 mm	ks	9,000	16,63	149,67	9,000	16,63	149,67			0,00 €
26	*5953172500*	*Preklad nenosný YTONG 1250x249x100*	*ks*	*4,000*	*23,32*	*93,28*	4,000	23,32	93,28			0,00 €
27	*5953172700*	*Preklad nenosný YTONG 1250x249x150*	*ks*	*5,000*	*32,22*	*161,10*	5,000	32,22	161,10			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
28	317121251	Montáž prekladu svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	18,25	18,25	1,000	18,25	18,25			0,00 €
29	*5953173001*	*Prekladový trámec YTONG 2000x124x150*	*ks*	*1,000*	*42,73*	*42,73*	1,000	42,73	42,73			0,00 €
30	330321410.S	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	14,100	118,10	1 665,21	14,100	118,10	1 665,21			0,00 €
31	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	139,000	27,98	3 889,22	139,000	27,98	3 889,22			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec
Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž
Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Spracoval:
Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
32	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	139,000	14,60	2 029,40	139,000	14,60	2 029,40			0,00 €
33	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 - orientačne	t	2,820	1 313,95	3 705,34	2,820	1 313,95	3 705,34			0,00 €
34	342272102	Priečky z tvárnic Ytong Klasic na tenkovrst.maltu hr.100 mm	m2	31,772	30,94	983,03	31,772	30,94	983,03			0,00 €
35	342272104	Priečky z tvárnic Ytong Klasic na tenkovrst.maltu hr.150 mm	m2	110,956	40,81	4 528,09	110,956	40,81	4 528,09			0,00 €
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**273 265,88**			**273 265,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	411321414	Betón stropov, prekladov, nosníkov, železový tr. C25/30	m3	561,278	113,19	63 531,06	561,278	113,19	63 531,06			0,00 €
37	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2 335,640	12,17	28 424,74	2 335,640	12,17	28 424,74			0,00 €
38	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2 335,640	10,95	25 575,26	2 335,640	10,95	25 575,26			0,00 €
39	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	2 278,600	7,30	16 633,78	2 278,600	7,30	16 633,78			0,00 €
40	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2 278,600	6,08	13 853,89	2 278,600	6,08	13 853,89			0,00 €
41	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov 10505 - orientačne	t	84,192	1 313,95	110 623,68	84,192	1 313,95	110 623,68			0,00 €
42	413351107	Debnenie nosníkov a vencov zhotovenie-dielce	m2	200,880	12,17	2 444,71	200,880	12,17	2 444,71			0,00 €
43	413351108	Debnenie nosníkov a vencov odstránenie-dielce	m2	200,880	10,95	2 199,64	200,880	10,95	2 199,64			0,00 €
44	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	1,500	7,30	10,95	1,500	7,30	10,95			0,00 €
45	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	1,500	6,08	9,12	1,500	6,08	9,12			0,00 €
46	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - zhotovenie	m2	66,960	7,30	488,81	66,960	7,30	488,81			0,00 €
47	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - odstránenie	m2	66,960	6,08	407,12	66,960	6,08	407,12			0,00 €
48	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,750	115,67	86,75	0,750	115,67	86,75			0,00 €
49	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,000	12,17	60,85	5,000	12,17	60,85			0,00 €
50	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,000	10,95	54,75	5,000	10,95	54,75			0,00 €
51	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30, interiér, exteriér	m3	6,206	132,70	823,54	6,206	132,70	823,54			0,00 €
52	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - orientačne	t	0,621	1 313,95	815,44	0,621	1 313,95	815,44			0,00 €
53	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,342	27,98	597,14	21,342	27,98	597,14			0,00 €
54	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,342	14,60	311,59	21,342	14,60	311,59			0,00 €
55	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,756	182,49	3 787,84	20,756	182,49	3 787,84			0,00 €
56	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,756	121,66	2 525,22	20,756	121,66	2 525,22			0,00 €
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**151 834,53**			**151 834,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	612462111	Vnútorná omietka stien sadrová	m2	276,658	15,21	4 207,97	276,658	15,21	4 207,97			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
58	612465115	Príprava podkladu,prednástrek Betonkontakt,pod omietky vnút.stien	m2	276,658	0,91	251,76	276,658	0,91	251,76			0,00 €
59	6159811323	Zateplenie žb a DT stien extr. polystyrénom hr. 100 mm	m2	947,100	25,42	24 075,28	947,100	25,42	24 075,28			0,00 €
60	625252526	Zateplenie stropov lepením, minerálna lamela Knauf CLT C1 Thermal hr. 200 mm	m2	1 995,900	60,88	121 510,39	1 995,900	60,88	121 510,39			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec
Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž
Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Spracoval:
Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
61	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	108,92	762,44	7,000	108,92	762,44			0,00 €
62	*5533198500*	*Zárubňa oceľová pre dvere 60-90x197 cm, hr. steny do 150 mm*	*ks*	*7,000*	*146,67*	*1 026,69*	7,000	146,67	1 026,69			0,00 €
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 233,02**			**13 483,09**	**608,80**	**358,73**	**967,53**
63	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky veľkosti do 1 m2 na stĺpiky, na konzolu alebo na zvislú železobetónovú konštrukciu	ks	7,000	57,43	402,01	17,000	57,43	976,31	574,30 €		574,30 €
		7 "počet zvislých DZ										
64	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*12,000*	*2,30*	*27,60*	27,000	2,30	62,10	34,50 €		34,50 €
		*2 "úchytky na jednu zvislú značku; 1 "úchytka na dodatkovú tabuľku; 5*2 + 2*1*										
65	*404410037500.S*	*Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*63,18*	*63,18*	1,000	63,18	63,18			0,00 €
		1 "DZ 202 - STOP, Daj presnosť v jazde										
66	*404410114700.S*	*Regulačná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*49,39*	*98,78*	2,000	49,39	98,78			0,00 €
		2 "DZ 272 - Parkovisko										
67	*404410112309.S*	*Značka o prednosti v jazde, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*63,18*	*126,36*	1,000	63,18	63,18		63,18 €	63,18 €
		2 "DZ 302 - Hlavná cesta										
68	*404410179050.S*	*Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*34,45*	*68,90*	2,000	34,45	68,90			0,00 €
		2 "DZ 506 - ZŤP										
69	914431111.S	Osadenie a montáž výškovej zábrany, oceľový profil, ukotvená do konštrukcie stropu pomocou reťaze, žlto - čierne refelexné prvky, čierne lemy po bokoch (ODHADOVANÁ CENA !!)	m	2,500	159,52	398,80	2,500	159,52	398,80			0,00 €
		2,5 "dĺžka vymedzovača výšky										
70	915716212.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	495,350	2,30	1 139,31	495,350	2,30	1 139,31			0,00 €
71	915716232.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná, šírky 120 mm	m	128,500	2,30	295,55	0,000	2,30	0,00		295,55 €	295,55 €
72	915716234.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná, šírky 250 mm	m	10,400	4,60	47,84	10,400	4,60	47,84			0,00 €
73	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	49,000	18,38	900,62	49,000	18,38	900,62			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
74	*404490010000.S.1*	*Označenie rohov stĺpov 90x90x1200 mm (rohovník), červeno-biele pruhy pod uhlom 45°, samolepiaca fólia, RA1, laminácia, šírka pruhov 200 mm, s montážou (ODHADOVANÁ CENA !!)*	*ks*	*84,000*	*45,94*	*3 858,96*	84,000	45,94	3 858,96			0,00 €
75	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
76	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
77	943943222	Montáž lešenia v šachte	m3	51,600	4,39	226,52	51,600	4,39	226,52			0,00 €
78	943943822	Demontáž lešenia v šachte	m3	51,600	1,76	90,82	51,600	1,76	90,82			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec
Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž
Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec
Spracoval:
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
79	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2 230,800	2,46	5 487,77	2 230,800	2,46	5 487,77			0,00 €
	99	**Presun hmôt HSV**				**22 711,87**			**22 711,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	1,000	22 711,87	22 711,87	1,000	22 711,87	22 711,87			0,00 €
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**155 515,49**			**155 515,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**89 495,47**			**89 495,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	711111211	Izolácia - hydroizolačný elasický náter, vodor. a zvislo okolo spŕch + rohová páska	m2	53,600	17,91	959,98	53,600	17,91	959,98			0,00 €
82	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	2 555,000	1,44	3 679,20	2 555,000	1,44	3 679,20			0,00 €
83	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	981,240	1,68	1 648,48	981,240	1,68	1 648,48			0,00 €
84	*11164101001*	*Penetračný náter*	*l*	*777,973*	*4,85*	*3 773,17*	777,973	4,85	3 773,17			0,00 €
85	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2 555,000	8,26	21 104,30	2 555,000	8,26	21 104,30			0,00 €
86	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	981,240	8,84	8 674,16	981,240	8,84	8 674,16			0,00 €
87	*2833000220*	*Izolácia proti tlakovej vode a radónu*	*m2*	*4 066,676*	*9,07*	*36 884,75*	4 066,676	9,07	36 884,75			0,00 €
88	*1085420000*	*Propan-butan v oceľových tlakovaných sudoch*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	0,000	0,00	0,00			0,00 €
89	711472054	Zhotovenie izolácie - drenážna fólia zvislá	m2	981,240	3,91	3 836,65	981,240	3,91	3 836,65			0,00 €
90	*6288000630*	*Drenážna fólia Dorken Dela Terraxx*	*m2*	*1 098,989*	*8,13*	*8 934,78*	1 098,989	8,13	8 934,78			0,00 €
91	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	894,955	0,00	0,00	894,955	0,00	0,00			0,00 €
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**485,45**			**485,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	7222411166	Hasiaci prístroj práškový, 6kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	9,000	47,45	427,05	9,000	47,45	427,05			0,00 €
93	7222411167	Hasiaci prístroj CO2, 5kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	1,000	58,40	58,40	1,000	58,40	58,40			0,00 €
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**9 541,87**			**9 541,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	181,280	0,18	32,63	181,280	0,18	32,63			0,00 €
95	763122142	SDK stena predsadená inštalačná impreg. doska, hr. 200 mm	m2	8,280	46,04	381,21	8,280	46,04	381,21			0,00 €
96	763132410.	SDK podhľad, doska GKFI hr. 2x12,5 mm	m2	173,000	42,55	7 361,15	173,000	42,55	7 361,15			0,00 €
97	763135010	Akustický podhľad Ecophon focus LP	m2	25,700	68,75	1 766,88	25,700	68,75	1 766,88			0,00 €
98	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	95,419	0,00	0,00	95,419	0,00	0,00			0,00 €
	767	**Kovové stavebné doplnkové konštrukcie**				**13 697,83**			**13 697,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla jednokrídlového, vrátane kovania, interiérové	ks	7,000	34,67	242,69	7,000	34,67	242,69			0,00 €
100	*553Z13*	*Oceľové jednokrídl. dvere 60-90/197 cm, plné*	*ks*	*7,000*	*674,56*	*4 721,92*	7,000	674,56	4 721,92			0,00 €
101	767646510	Montáž zárubne a kovového dverového krídla jednokrídlového, vrátane kovania	ks	4,000	46,23	184,92	4,000	46,23	184,92			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
102	*DP1DP1*	*Oceľ. 1-krídl. dvere 80,90/197 cm, požiarne EW, EI-C 45 D1, otočné, plné*	*ks*	*3,000*	*819,43*	*2 458,29*	3,000	819,43	2 458,29			0,00 €
103	*DP1DP0*	*Exter. vchodové 1-krídl. dvere 90/197 cm, otočné, plné*	*ks*	*1,000*	*1 233,19*	*1 233,19*	1,000	1 233,19	1 233,19			0,00 €
104	767646521	Montáž zárubne a požiarneho kovového dverového krídla dvojkrídlového, vrátane kovania	ks	3,000	92,46	277,38	3,000	92,46	277,38			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec
Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž
Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Spracoval:
Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
105	*DP1DP2*	*Oceľ. 2-krídl. dvere 120/230 cm, požiarne EW-C 45 D1, otočné, plné*	*ks*	*1,000*	*1 483,96*	*1 483,96*	1,000	1 483,96	1 483,96			0,00 €
106	*DP1DP3*	*Oceľ. 2-krídl. dvere 150/197 cm, požiarne EI-C 45 D1, otočné, plné*	*ks*	*1,000*	*1 370,05*	*1 370,05*	1,000	1 370,05	1 370,05			0,00 €
107	*DP1DP4*	*Oceľ. 2-krídl. dvere 180/230 cm, požiarne EI-C 45 D1, otočné, plné*	*ks*	*1,000*	*1 725,43*	*1 725,43*	1,000	1 725,43	1 725,43			0,00 €
108	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	136,978	0,00	0,00	136,978	0,00	0,00			0,00 €
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**10 029,35**			**10 029,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109	771473114	Montáž soklov rovných do lepidla	m	104,290	10,29	1 073,14	104,290	10,29	1 073,14			0,00 €
110	771575208	Montáž podláh z dlaždíc gres. ukladanie do lepidla	m2	173,000	28,89	4 997,97	173,000	28,89	4 997,97			0,00 €
111	*59764047001*	*Dlaždice gresové protišmykové*	*m2*	*190,300*	*20,80*	*3 958,24*	190,300	20,80	3 958,24			0,00 €
112	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,294	0,00	0,00	100,294	0,00	0,00			0,00 €
	773	**Podlahy z liateho teraca**				**5 584,35**			**5 584,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	777245430	Podlahy z liateho terazza hr. 20 cm	m2	25,700	217,29	5 584,35	25,700	217,29	5 584,35			0,00 €
114	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	55,844	0,00	0,00	55,844	0,00	0,00			0,00 €
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**7 971,67**			**7 971,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	781445017	Montáž obkladov stien z gresu do tmelu	m2	137,942	34,67	4 782,45	137,942	34,67	4 782,45			0,00 €
116	*5976582601*	*Obkladačky gresové hladké*	*m2*	*151,736*	*20,80*	*3 156,11*	151,736	20,80	3 156,11			0,00 €
117	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov, soklov a dlaždíc	m2	137,942	0,24	33,11	137,942	0,24	33,11			0,00 €
118	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	79,717	0,00	0,00	79,717	0,00	0,00			0,00 €
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**16 620,59**			**16 620,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	783824120	Náter uzatvárací, protiprašný na pohľadový betón podláh, stien, stropov	m2	2 898,930	5,54	16 060,07	2 898,930	5,54	16 060,07			0,00 €
120	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	173,000	3,24	560,52	173,000	3,24	560,52			0,00 €
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**2 088,91**			**2 088,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	784496501	Ostatné práce - penetrácia stien, stropov, podláh	m2	3 071,930	0,68	2 088,91	3 071,930	0,68	2 088,91			0,00 €
		Celkom DSP riešenie				**1 361 911,60**			**1 362 161,67**	**608,80**	**358,73**	**967,53**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec
Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž
Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec — Spracoval:
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. — Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
Nové položky - Dodatok č.1						**-**			**1 010,88**	**1 010,88**	**-**	**1 010,88**
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**			**1 010,88**	**1 010,88**	**0,00**	**1 010,88**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**			**1 010,88**	**1 010,88**	**0,00**	**1 010,88**
	404410112881	*Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*2,000*	63,18	126,36	126,36 €		126,36 €
	404410033905	*Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*2,000*	63,18	126,36	126,36 €		126,36 €
	404410034225	*Regulačná značka ZDZ 210-30 "Prikázaný smer jazdy (priamo)"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*2,000*	63,18	126,36	126,36 €		126,36 €
	404410034175	*Regulačná značka ZDZ 210-10 "Prikázaný smer jazdy (vľavo)"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*1,000*	63,18	63,18	63,18 €		63,18 €
	404410037080	*Regulačná značka ZDZ 270 "Zákaz zastavenia"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*1,000*	63,18	63,18	63,18 €		63,18 €
	404410035280	*Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu"*	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*3,000*	63,18	189,54	189,54 €		189,54 €
		Tabuľa - EXIT	*ks*	*0,000*	*0,00*	*0,00*	*5,000*	63,18	315,90	315,90 €		315,90 €
ZoD:						**1 361 911,60**			**1 362 161,67**	**608,80**	**358,73**	**967,53**
Dodatok č.1:						**-**			**1 010,88**	**1 010,88**	**-**	**1 010,88**
CELKOM:						**1 361 911,60**			**1 363 172,55**	**1 619,68**	**358,73**	**1 978,41**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**474 662,67**			**473 401,72**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**
	1	**Zemné práce**				**24 700,31**			**24 700,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	12110111201.S	Odstránenie zatrávnenej vrstvy s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	89,850	6,11	548,98	89,850	6,11	548,98			0,00 €
2	122302202.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3 (	m3	395,210	4,93	1 948,39	395,210	4,93	1 948,39			0,00 €
3	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	395,210	0,44	173,89	395,210	0,44	173,89			0,00 €
4	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 (PREDPOKLADÁME HORNINU triedy ťažiteľnosti 4)	m3	36,450	15,92	580,28	36,450	15,92	580,28			0,00 €
5	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	36,450	2,55	92,95	36,450	2,55	92,95			0,00 €
6	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m (V PRÍPADE NEVHODN	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (V PRÍPADE NEVHO	m3	521,510	4,26	2 221,63	521,510	4,26	2 221,63			0,00 €
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 , v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatýc	m3	6 258,120	0,64	4 005,20	6 258,120	0,64	4 005,20			0,00 €
9	167101102.S	Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	938,718	12,74	11 959,27	938,718	12,74	11 959,27			0,00 €
11	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 420,000	1,53	2 172,60	1 420,000	1,53	2 172,60			0,00 €
12	181301103.S	Rozprestretie a urovnanie ornice alebo zatrávnenej vrstvy s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm (UVAŽUJEME S ROZPRESTRENÍM NA POZE	m2	328,000	3,04	997,12	328,000	3,04	997,12			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
	2	**Zakladanie**				**5 388,37**			**5 388,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	27,338	57,33	1 567,26	27,338	57,33	1 567,26			0,00 €
14	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	243,000	3,18	772,74	243,000	3,18	772,74			0,00 €
15	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	3,038	51,60	156,74	3,038	51,60	156,74			0,00 €
16	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	121,500	8,98	1 091,07	121,500	8,98	1 091,07			0,00 €
17	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	603,000	1,27	765,81	603,000	1,27	765,81			0,00 €
18	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*663,300*	*1,56*	*1 034,75*	663,300	1,56	1 034,75			0,00 €
	5	**Komunikácie**				**392 624,08**			**391 363,13**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**
19	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	531,000	6,33	3 361,23	531,000	6,33	3 361,23			0,00 €
20	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 540,812	9,61	14 807,20	1 540,812	9,61	14 807,20			0,00 €
21	565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr.50 mm	m2	376,600	18,86	7 102,68	376,600	18,86	7 102,68			0,00 €
22	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	606,015	31,02	18 798,59	606,015	31,02	18 798,59			0,00 €
23	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	1 402,500	20,51	28 765,28	1 402,500	20,51	28 765,28			0,00 €
24	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	925,752	19,83	18 357,66	925,752	19,83	18 357,66			0,00 €
25	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	615,060	26,40	16 237,58	615,060	26,40	16 237,58			0,00 €
26	573131101.S.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	376,600	0,95	357,77	376,600	0,95	357,77			0,00 €
27	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	606,015	1,08	654,50	606,015	1,08	654,50			0,00 €
28	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	603,000	0,63	379,89	603,000	0,63	379,89			0,00 €
29	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	603,000	20,74	12 506,22	603,000	20,74	12 506,22			0,00 €
30	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI hr. 200 mm	m2	376,600	45,50	17 135,30	405,674	45,50	18 458,17	1 322,87 €		1 322,87 €
31	773511360.S	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	1 375,000	154,88	212 960,00	1 370,751	154,88	212 301,91		658,09 €	658,09 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
32	773519090.S	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché Príplatok k cene za biely cement	m2	1 375,000	0,01	13,75	1 370,751	0,01	13,71		0,04 €	0,04 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
33	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmetením prebytočného materiálu na krajnicu, do lôžka drobných z kameňa, do lôžka z cementovej malty	m2	531,000	30,67	16 285,77	506,500	30,67	15 534,36		751,41 €	751,41 €
34	*583810000900.S*	*Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm*	*m2*	*523,260*	*46,99*	*24 587,99*	498,270	46,99	23 413,71		1 174,28 €	1 174,28 €
35	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*18,360*	*17,03*	*312,67*	18,360	17,03	312,67			0,00 €
	8	**Rúrové vedenie**				**2 817,76**			**2 817,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov (KOMPLETNE RIEŠENÉ V PROJEKTE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE!)	ks	8,000	352,22	2 817,76	8,000	352,22	2 817,76			0,00 €
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**47 906,48**			**47 906,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	113107232.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
38	113307231.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
39	113152340.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 500 do 1000 m2, pruh šírky cez 0,5 m do 1 m hr. 100 mm -0,254 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
40	113152130.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 50 mm -0,127 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
41	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2 -0,260 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
42	113307121.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 100 mm -0,130 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
43	113307212.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,240 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
44	113307124.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm -0,560 t	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
45	113209021.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého tr. C 12/15, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky do 150 mm -0,03450t	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
46	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých - 0,290 t	m	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
47	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	6,38	121,22	19,000	6,38	121,22			0,00 €
48	*404410033942.S*	*Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 750 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*58,58*	*117,16*	2,000	58,58	117,16			0,00 €
		2 "DZ 201 - Daj prednosť v jazde										
49	*404410084700.S*	*Regulačná príkazová značka, rozmer 600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*52,83*	*52,83*	1,000	52,83	52,83			0,00 €
		1 "DZ 211-20										
50	*404410044700.S*	*Regulačná zákazová značka, rozmer 420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*3,000*	*27,57*	*82,71*	3,000	27,57	82,71			0,00 €
		1 "DZ 231; 1 "DZ 233; 1 "DZ 243-2,1										
51	*404410114600.S*	*Regulačná informatívna značka, rozmer 420x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*31,01*	*31,01*	1,000	31,01	31,01			0,00 €
		1 "DZ 272-50 parkovisko v garáži										
52	*404410114700.S*	*Regulačná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*5,000*	*49,39*	*246,95*	5,000	49,39	246,95			0,00 €
		3 "DZ 272; 1 "DZ 272-10; 1 "DZ 272-20										
53	*404410175624.S*	*Značka návesť, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*49,39*	*98,78*	2,000	49,39	98,78			0,00 €
		2 "DZ325 Priechod pre chodcov										
54	*404410179050.S*	*Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*34,45*	*68,90*	2,000	34,45	68,90			0,00 €
		1 "DZ 503; 1 "DZ 506-ZŤP										
55	*404410182254.S*	*Špeciálna dodatková tabuľa, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*49,39*	*49,39*	1,000	49,39	49,39			0,00 €
		1 "DZ 507-139-2										
56	*404410182134.S*	*Špeciálna dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*34,45*	*68,90*	2,000	34,45	68,90			0,00 €
		2 "DZ 532-53 - 1 hod.										
57	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	43,39	433,90	10,000	43,39	433,90			0,00 €
58	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*32,000*	*2,30*	*73,60*	32,000	2,30	73,60			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
59	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*35,000*	*9,19*	*321,65*	35,000	9,19	321,65			0,00 €
60	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*10,000*	*0,64*	*6,40*	10,000	0,64	6,40			0,00 €
61	915716212.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	100,645	2,30	231,48	100,645	2,30	231,48			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
62	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	37,950	18,38	697,52	37,950	18,38	697,52			0,00 €
63	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	380,400	19,14	7 280,86	380,400	19,14	7 280,86			0,00 €
64	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*95,243*	*4,94*	*470,50*	95,243	4,94	470,50			0,00 €
65	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, Skosenia 120/40*	*ks*	*284,315*	*4,68*	*1 330,59*	284,315	4,68	1 330,59			0,00 €
66	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*4,646*	*6,39*	*29,69*	4,646	6,39	29,69			0,00 €
67	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	105,000	11,59	1 216,95	105,000	11,59	1 216,95			0,00 €
68	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*106,050*	*1,47*	*155,89*	106,050	1,47	155,89			0,00 €
69	919716111.S.1	Oceľová výstuž cementobetónového krytu spevnených plôch zo zvarovaných sietí KARI	t	8,168	1 313,95	10 731,69	8,168	1 313,95	10 731,69			0,00 €
70	919716111.S.2	Oceľová výstuž cementobetónového krytu spevnených plôch zo zvarovaných sietí KARI	t	3,333	1 199,11	3 996,53	3,333	1 199,11	3 996,53			0,00 €
71	9197267110.S	Tesnenie kontrakčných škár zálievkou za tepla vrátane zarezania, škára šírky 8 mm	m	35,000	3,04	106,40	35,000	3,04	106,40			0,00 €
72	919726711.S.1	Tesnenie škár zálievkou za tepla vrátane zarezania	m	167,000	3,04	507,68	167,000	3,04	507,68			0,00 €
73	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	167,000	9,71	1 621,57	167,000	9,71	1 621,57			0,00 €
74	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	167,000	21,95	3 665,65	167,000	21,95	3 665,65			0,00 €
75	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	71,400	39,44	2 816,02	71,400	39,44	2 816,02			0,00 €
76	*592270008100.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*2,000*	*12,75*	*25,50*	2,000	12,75	25,50			0,00 €
77	*592270017400.S*	*Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dĺ. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*142,800*	*28,56*	*4 078,37*	142,800	28,56	4 078,37			0,00 €
78	*592270024700*	*Odvodňovací žľab univerzálny, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s liatinovou hranou*	*ks*	*71,400*	*76,28*	*5 446,39*	71,400	76,28	5 446,39			0,00 €
79	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	5,000	31,38	156,90	5,000	31,38	156,90			0,00 €
80	*592270007700.S*	*Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200*	*ks*	*5,000*	*162,50*	*812,50*	5,000	162,50	812,50			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
81	*592270008000.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*5,000*	*23,74*	*118,70*	5,000	23,74	118,70			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
82	*592270016700.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm*	*ks*	*5,000*	*127,14*	*635,70*	5,000	127,14	635,70			0,00 €
83	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
84	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 15 km)	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
85	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
86	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
87	979093512.1.S	Drvenie a triedenie stavebného odpadu z demolácií, podkladné vrstvy vybúraných konštrukcií vozoviek, drvené kamenivo	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
88	171209002.1.S	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné (podkladné vrstvy vybúraných vozoviek) - 30%	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
89	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
90	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 225,67**			**1 225,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 501,360	0,49	1 225,67	2 501,360	0,49	1 225,67			0,00 €
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**14 265,37**			**14 265,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	364,99	364,99	1,000	364,99	364,99			0,00 €
93	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	3 649,86	3 649,86	1,000	3 649,86	3 649,86			0,00 €
94	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	364,99	364,99	1,000	364,99	364,99			0,00 €
95	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (podľa plánu organizácie dopravy)	eur	1,000	2 433,24	2 433,24	1,000	2 433,24	2 433,24			0,00 €
96	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	7 452,29	7 452,29	1,000	7 452,29	7 452,29			0,00 €
97	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
98	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €
99	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00 €

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**

Časť:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
		Celkom DSP riešenie				**488 928,04**			**487 667,09**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**
Objekt: **SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy**
Časť:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dátum: 25.7.2025

Zmena č.3 - Zmena organizácie dopravy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prepočet množstva	Cena jednotková	Cena celkom	Prípočty	Odpočty	Prípočty + odpočty
1	2	3	4	5	6	7						
Nové položky - Dodatok č.1						-						
ZoD:						**488 928,04**			**487 667,09**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**
Dodatok č.1:						-			-	-	-	-
CELKOM:						**488 928,04**			**487 667,09**	**1 322,87**	**2 583,82**	**3 906,69**

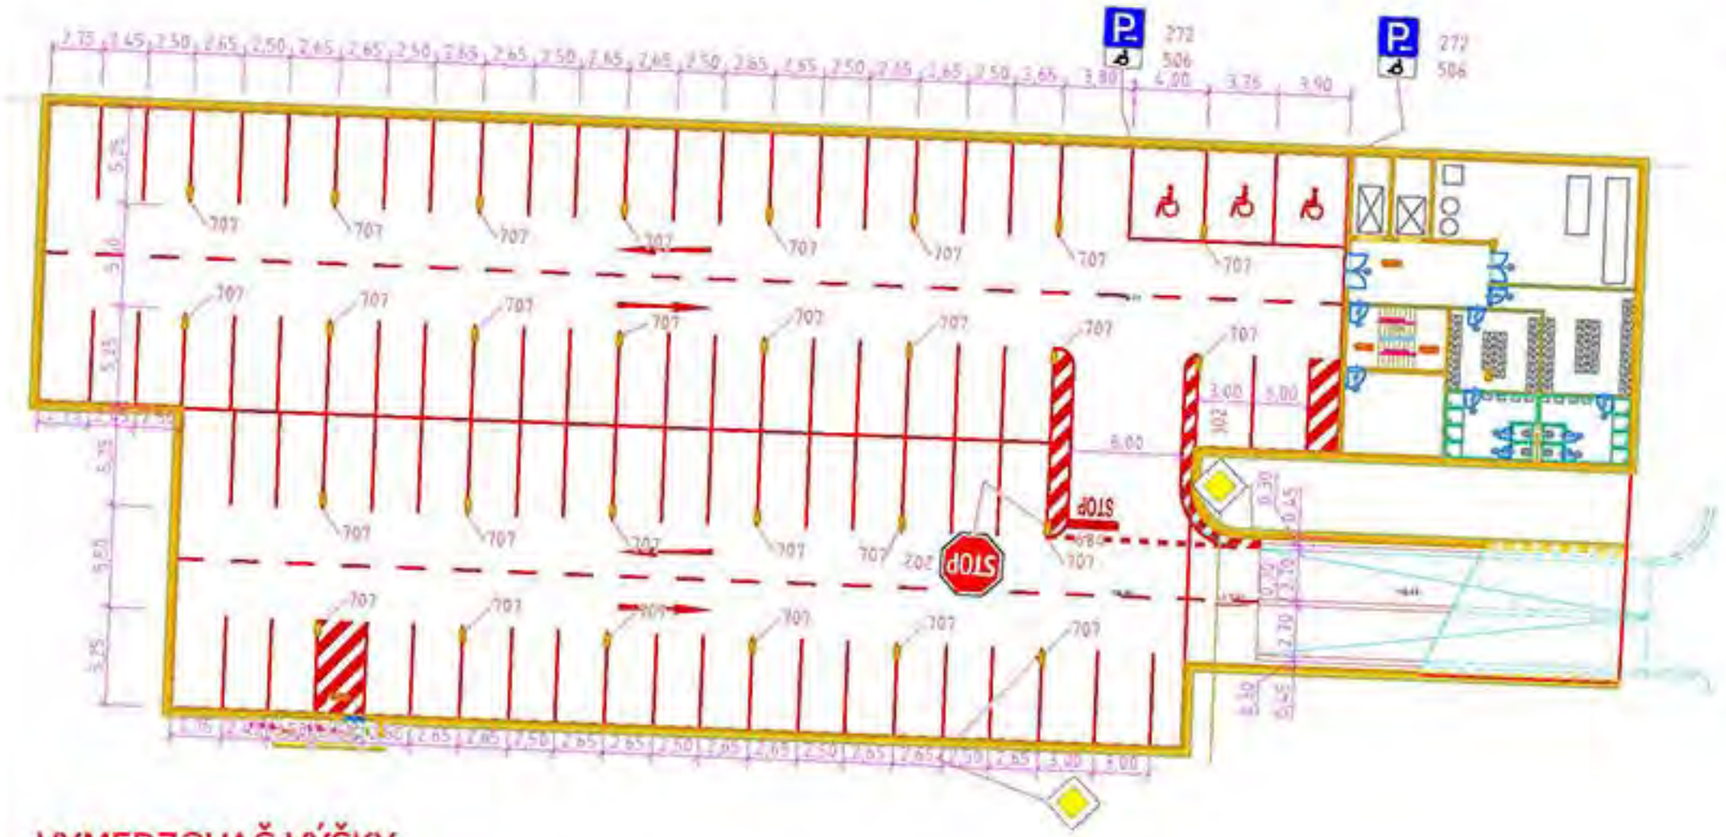


POZNÁMKY

1. GRAFICKÉ VYOBRAZENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA JE LEN SCHÉMATICKÉ A SKUTOČNÉ VYOBRAZENIE MUSÍ BYŤ V SÚLADE S VYHLÁŠKOU MV SR 30/2020 Z.Z.
2. EXISTUJÚCE VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE SA V POTREBNOM ROZSAHU ODSTRÁNI (NAPR. ZATREI)
3. ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE OSADENÉ NA POZINKOVANEJ TYČOVINE ALEBO NA STĹPOCH VEREJNÉHO OSVETLENIA
4. ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE VYHOTOVENÉ S FÓLIOU TRIEDY R=T1 A R1
5. VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE VYHOTOVENÉ V BIELEJ FARBE
6. POŽIADAVKY NA VYHOTOVENIE A KVALITU DOPRAVNÝCH ZNAČIEK PREDPÍSUJE TP 4/2005 (TP 812)
7. OKRAJ DZ NESMIE ZASAHOVAŤ DO VOĽNEJ ŠÍRKY KOMUNIKÁCIE A SPODNÝ OKRAJ DZ JE MIN. 2,5 m NAD POVRCHOM KOMUNIKÁCIE
8. TÁTO DOKUMENTÁCIA SLÚŽI NA ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA, NESLÚŽI AKO REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA
9. NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SPREVODNÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
10. TÁTO DOKUMENTÁCIA NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UPRAVOVANÁ ALEBO NAPODOBŇOVANÁ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA ALEBO ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
11. PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
12. SPÔSOB POUŽITEJ TECHNOLÓGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUPY VÝROBY JE V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA
13. ROZMERY NEUVEDENÉ V TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERAŤ

VYMEDZOVAČ VÝŠKY




OZNAČENIE ZVISLÝCH PREKÁŽOK A RAMPY DZ 707

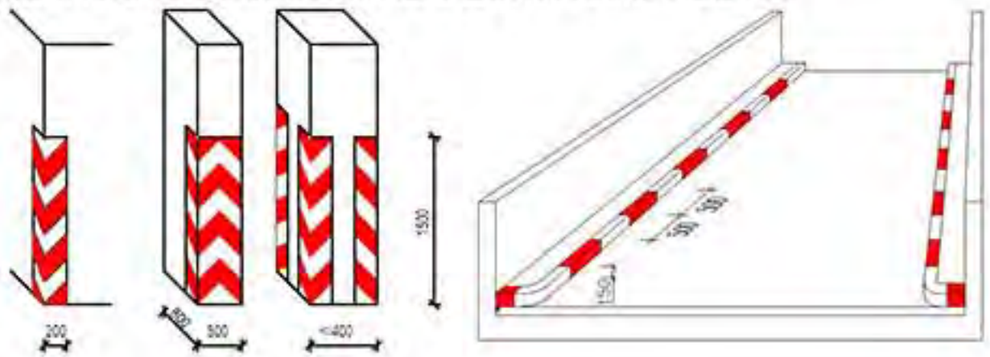

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: Ing. Marek Lettrich	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Norbert Nemec	NEVIANO DESIGN	
KONTROLOVAL: Ing. Norbert Nemec	HL. PROJEKTANT: Ing. arch. Štefan Rafanides		
MIESTO STAVBY: Námestie 1. Mája, Senec, p.č. 806, 809, 931/3, 931/4			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Senec			
STAVBA: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky SENEC		STUPEŇ: DSP	
		DÁTUM: 09/2022	
OBJEKT: SO 101.3 PRÍSTAVBA POLIKLINIKY - ZAKLADANIE A PODZEMNÁ GARÁŽ		Č.ZÁKAZKY: -	
		M 1:300	297x420
PRÍLOHA: HROMADNÁ GARÁŽ		REVÍZIA: X	VÝKRES Č.: 02

NEVIANO DESIGN
NEVIANO Design s.r.o.
Sídlo: Račianska 26/D
Kancelária: Lamačská cesta 45
831 02 Bratislava
Tel: +421 911 427 336
Email: neviano@neviano.sk

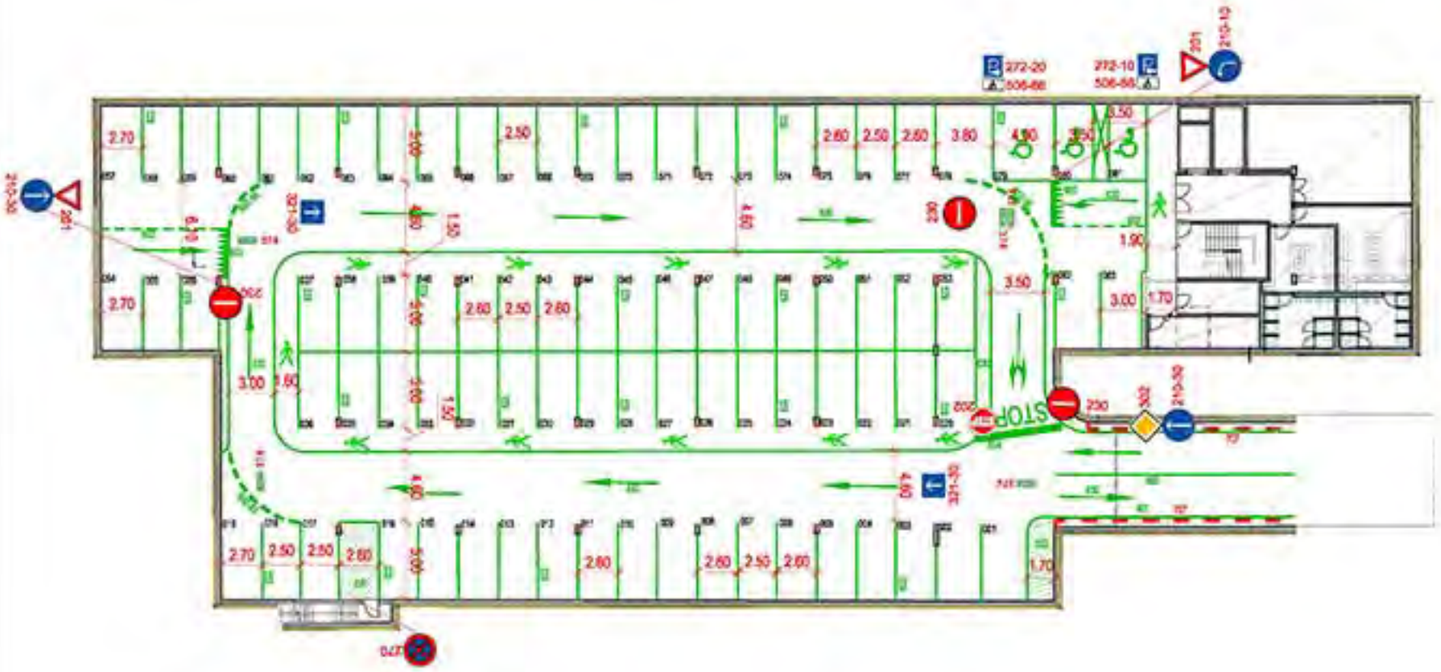

Legenda:

201 — zvislá dopravná značka číslo

— — — vodorovné dopravné značenie vyhotovené farbou v zmysle Vyhlášky 35/2025 § 16 ods. 4

— — — značenie 301 na zvislých prvkoch

Dopravné značenie je potrebné vyhotoviť a osadiť v zmysle Vyhlášky 35/2025 o podrobnostiach na pozemných komunikáciách, STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2, TP 01/2009, Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na pozemných komunikáciách, a všetkých súvisiacich platných technických noriem a predpisov.

Označenie prvkov:



POZNÁMKA:
Okolo a farba bude vykreslená po projekte prípadne. Kolmovanie a použitie mi ani jednotlivé použitie je zakázané.
Projektová dokumentácia stupňa pre ďalší stavebný povolenie a realizačnú realizačný projekt
stupňa + 127,00 m n.m.

Autor projektu do stupňa RP:	
B-KONSTRUKT a.r.o., Jasenského 12, 911 01 Trenčín Ing. Juraj Bielica-6842*A1, Ing. Š. ELEK-7072*1, Ing. M. Baník	B-KONSTRUKT a.r.o.
Ing. arch. Andrej Vojtko, Ing. arch. Kristián Ján Vidiš, Ing. arch. Simona Pizyblová, Bc. Michal Barbič, Ing. Štefan Elek, Ing. Silvia Tan	
Zhotoviteľ stavby:	
STRABAG s.r.o., Mýtská Nivy 81/A 825 18 Bratislava Ing. Andrej Kollar	STRABAG
Rekonštrukcia a prístavba polikliniky SENEC	
Námestie 1 Mája,Senec, p.č. 808, 809, 981/3, 981/4	
Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec	
Ing. Stanislav Majerčák - 5177*2	

Realizačný projekt		1:200	RP
E1-3 Hromadná garáž		4xA4	E1-3
Trvalé dopravné značenie na 1.PP		10/2025	002
Arch.+Doprava	SO.101.3	2025025	00

Príloha č.3

EXISTUJÚCE STOJANY NA BICYKLE

DOČASNÉ PARKOVACIE STOJISKÁ V BUDÚCNOSTI BUDÚ ZRUŠENÉ A NAHRADENÉ ZASTÁVKOU MHD

EXISTUJÚCA CYKLOTRASA

VSTUPNÁ ZÁVORA

trafostanica

LEGENDA


POZNÁMKY

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VYPRACOVAL: Ing. Marek Lyttich	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Norbert Bobál
KONTROLOVAL: Ing. Norbert Bobál	HL. PROJEKTANT: Ing. arch. Štefan Kahaľák
MIESTO STAVBY: Námestie 1. mája, Senec, p.č. 808, 809, 981/3, 981/4	
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Senec	

NEVIANO DESIGN
NEVIANO Design, s.r.o.
Sídlo: Vodárenská 29/B
Kancelária: Lomnické sedlo 45
821 02 Bratislava
Tel: +421 911 627 239
Email: nevianodesign.sk

STAVBA: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky SENEC	STUPEŇ: DSP
	DÁTUM: 01/2022
OBJEKT: SO 201 AUTOMOBILOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 202 PEŠIE KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	Č. ZÁKAZKY: ...
	M: 1:250
PRÍLOHA: SITUÁCIA	REVÍZIA: X
	VÝKRES Č.: 2.2

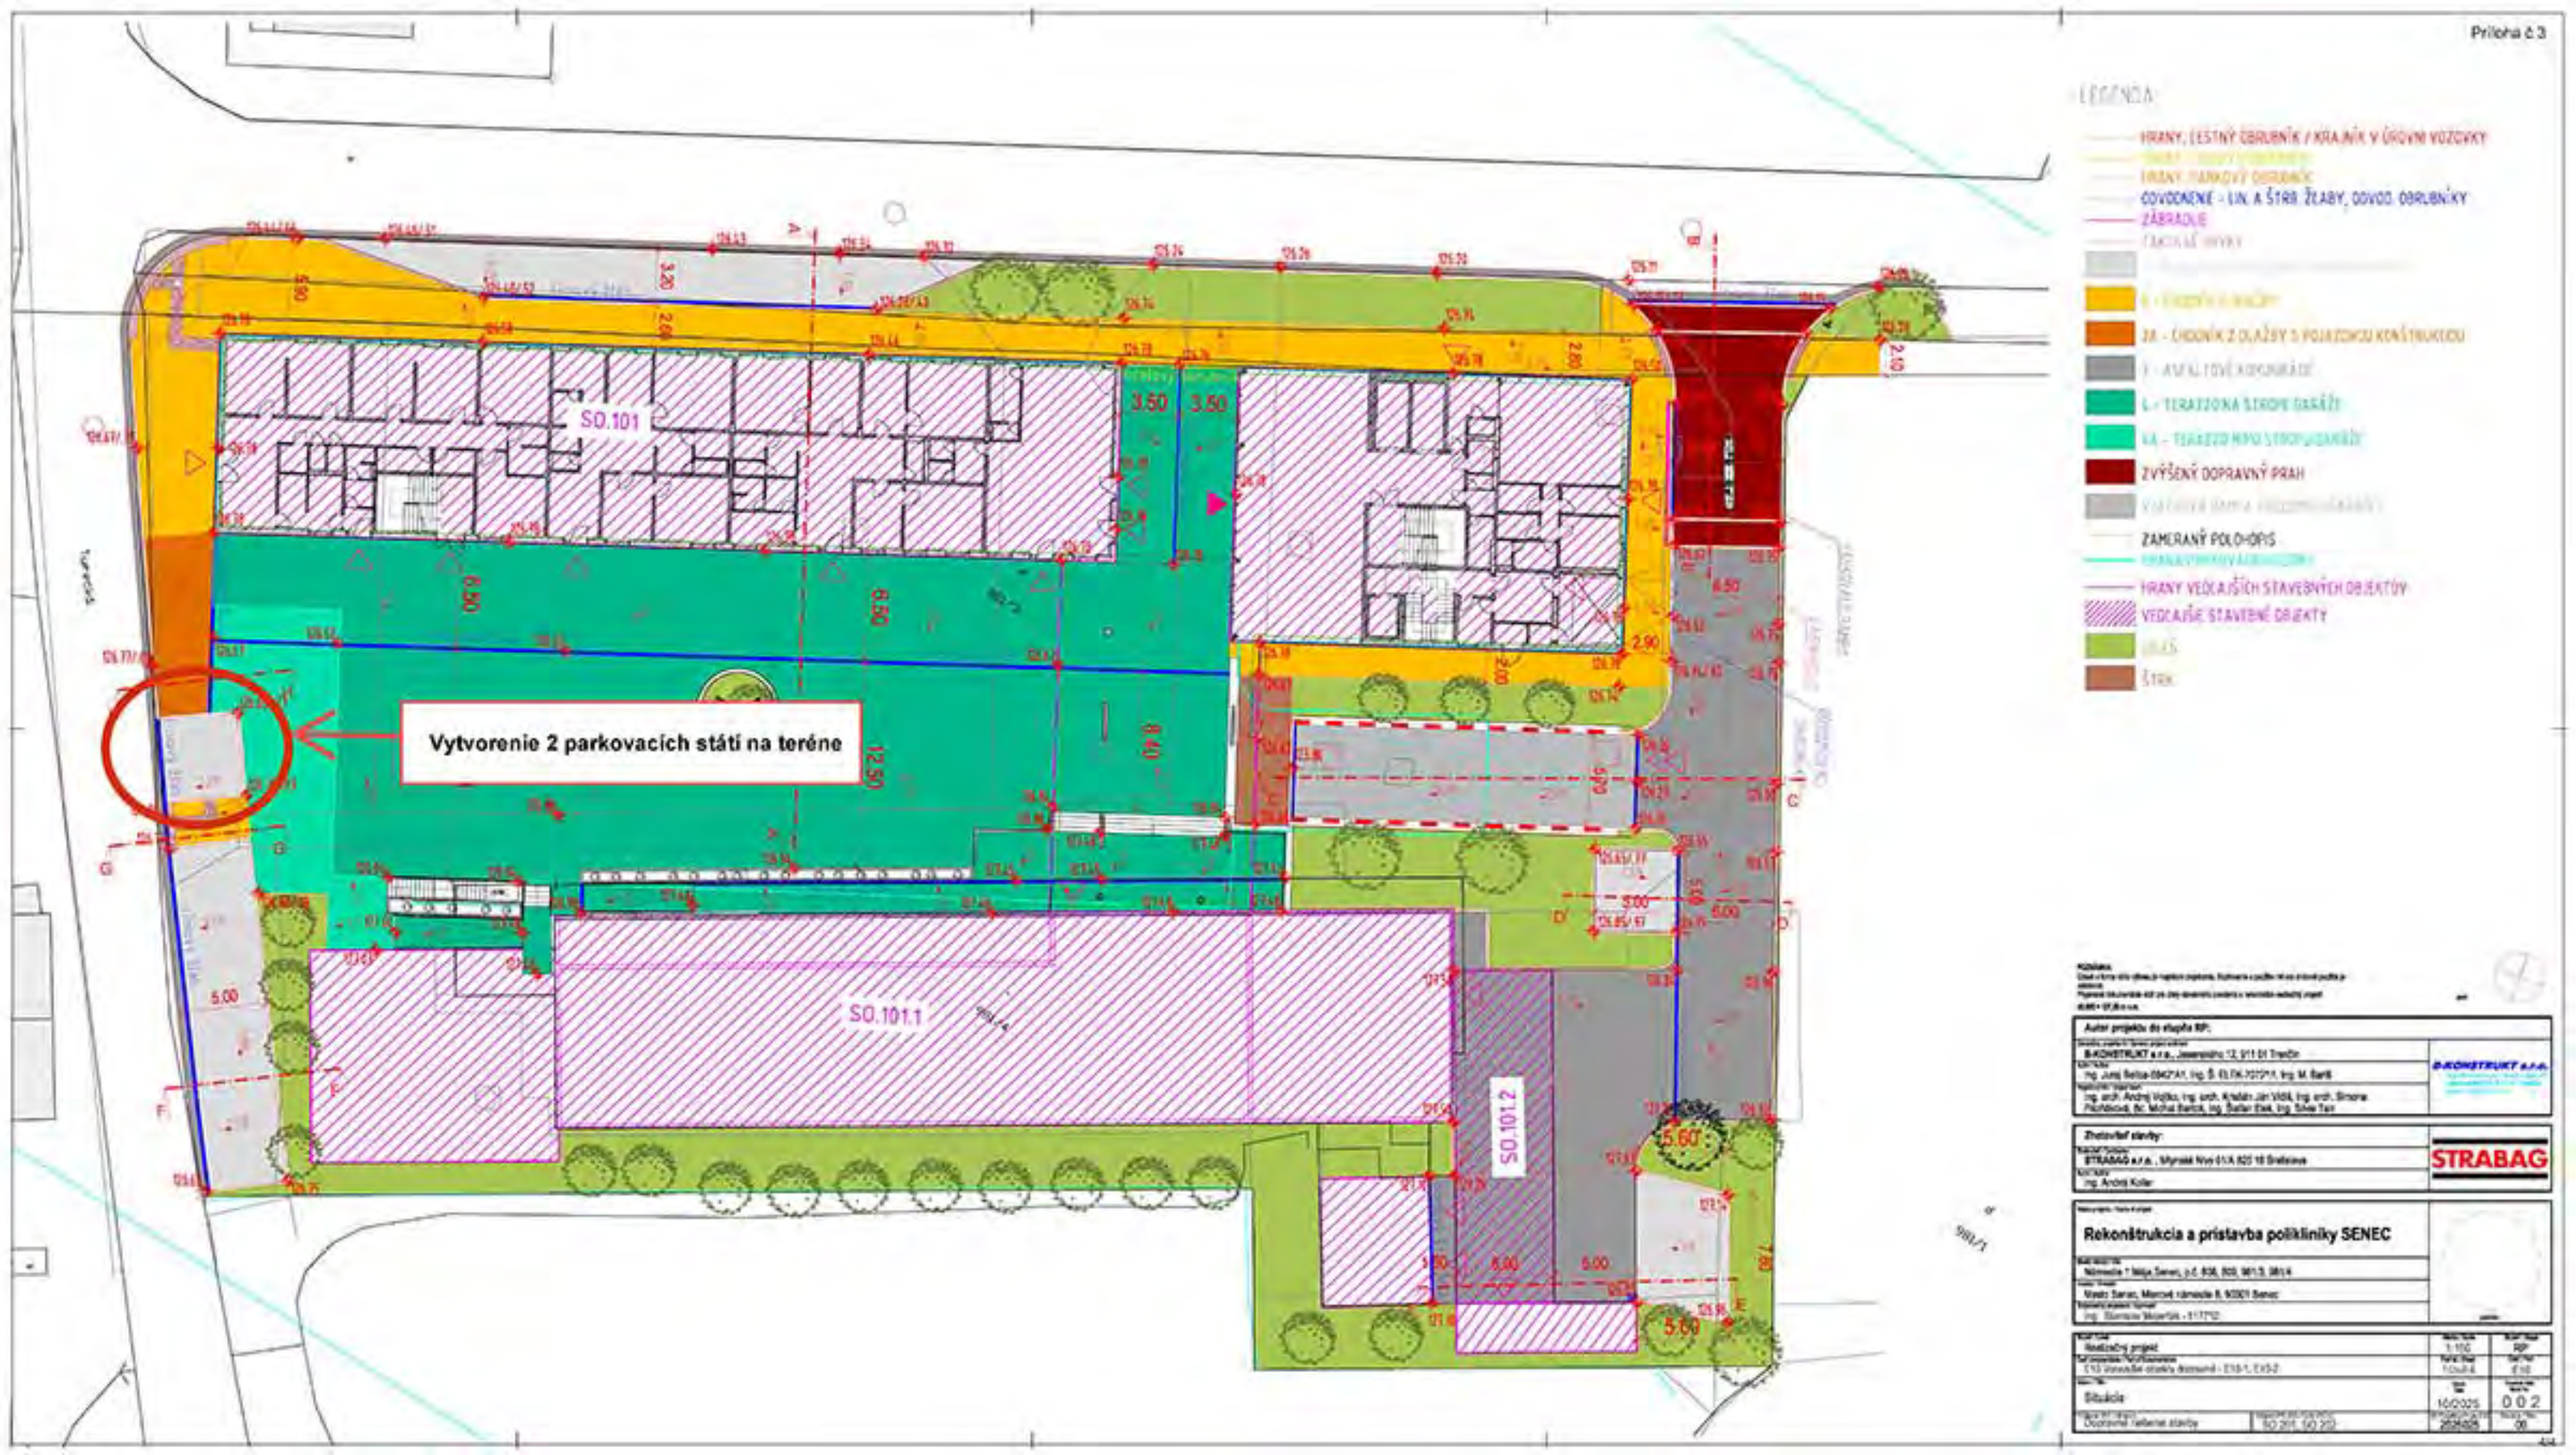

Autor projektu do stupňa RP:
BAKONSTRUKT s.r.o., Jasenského 12, 911 01 Trenčín
Ing. Juraj Belica 0940*AA, Ing. Š. ČLEN 7072*11, Ing. M. Barlé

Zhotoviteľ stavby:
STRABAG a.r.o., Mýtnické Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Ing. Andrej Koller

STRABAG

Rekonštrukcia a prístavba poliklinky SENEC

Nám. slobody 1, Senec, p.č. 838, 839, 961/3, 3814
Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec
Ing. Stanislav Mojerčák - 517*10

Realizačný projekt	1:100	RP
Čiastkový Projektový stupeň: D10-1, D10-2	Formát: A4	Dátum: 6.25
Názov: Situácia	Dátum: 10/2025	Číslo: 002
Názov stavby: Dostavba Poliklinika SENEC	Miesto stavby: SO 201, SO 202	Revízne číslo: 00

VEC: Prehlásenie
Stavba: REKONŠTUKCIA A PRÍSTAVBA POLIKLINIKY SENEC – SO 101.3 - HROMADNÁ GARÁŽ

Spoločnosť B-KONSTRUKT s.r.o. v zastúpení Ing. Štefan Elek ako HIP – hlavný inžinier projektu, Autoriz. stav. inž. SKSI, týmto čestne prehlasuje a zdôvodňujem nutné úpravy pôvodného riešenia dopravného usporiadania v 1.PP podzemnej hromadnej garáži nasledovne:

Pôvodné riešenie:
Vstup aj výstup a pohyb po podzemnej garáži bol navrhovaný po obojsmerných komunikáciách ale v minimálnych rozmeroch. Takto vzniknuté križovatky a napojenia nemali na to riešené parametre, boli dopravne nevyhovujúce pre obojsmernú premávku, aká tam bola zamýšľaná. Navrhované vetvy podzemnej garáže boli navyše slepé bez možnosti otáčania sa. Predpokladalo sa otáčanie na voľných parkovacích miestach, čo je pri plne obsadenej vetve – vzhľadom na minimálne rozmery veľmi obťažné. Parkovacie miesta mali len 5m, čo spôsobuje pri klasickom kolmom parkovaní odstup od steny minimálne 20 až 40 cm, čo je automaticky dĺžka ktorou vozidlo pretŕča do komunikácie. V prípade väčších vozidiel to môže byť aj 0,5 či 0,7m (pri autách kombi, ktoré sú dosť bežné). Ak je to zúžené z dvoch strán tak sa môže zúžiť navrhovaná komunikácia bez odstupom v čistej šírke medzi parkovacími miestami zo 6m – 2x 0,7 = iba 4,6 m čo je menej ako potrebných minimálne 5,5m pre obojsmernú premávku. Je tu nízka intenzita vozidiel avšak „pôvodné riešenie“ bolo navrhované pre obojsmernú premávku, kde by boli kolízie len otázkou času. Zároveň nerieši pohyb peších, čo už je v dnešnej dobe žiadaným štandardom.

Navrhované riešenie:
V novom návrhu je riešený jednosmerný cyklický systém, kde je možné bezproblémové hľadanie parkovacieho miesta či pohyb po garáži. Odpadá tu otáčanie vozidiel, keďže je tu vytvorený prirodzený okruh. Navyše riziko stretu vozidiel je značne znížené – vzhľadom na jednosmerné vedenie vozidiel. Parkovanie je menej rizikové vzhľadom na pohyb v strede a jedným smerom, a rovnako sú tu vytvorené chodecké koridory.
Nový systém s množstvom výhod, jednoduchšom, prehľadnejšom, a bezpečnejšom systéme parkovania si vyžiadal oproti pôvodnému nevhodnému riešeniu iba zrušenie štyroch parkovacích miest, ktoré boli nahradené dvomi parkovacími miestami v garáži a 2 parkovacím miestom na povrchu. Bude nutné premiestniť na teréne existujúci sklad odpadkov mimo navrhovaných statí.
Zároveň prehlasujem, že v zmysle platnej STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a súvisiacich platných predpisov hlavne Zákon č. 135/1961 Zb., č. 315/1996 Z.z., vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z. je nový systém dopravného riešenia jednoduchší a najvýhodnejší vzhľadom na bezpečné vedenie vozidiel, parkovanie a hlavne pre pohyb chodcov po garáži vytvorením koridorov.

Ing. Štefan Elek
Autor. stav. inž, č.o. 7072*I1
HIP

V Bratislave 10.12.2025



RealLife

Real Life, s.r.o. Na Pažiti 835/1, 911 05 Trenčín

Mesto Senec
Mierové Námestie č. 8
903 01 Senec

Vec: Stanovisko TDI k Ponuke na zmenu č. 3 – Stavba: „Úprava dopravného riešenia – objekt polikliniky"

Vážený investor,
ako technický dozor investora som posúdil požiadavku zhotoviteľa na zmenu rozsahu diela formou Ponuky na zmenu č. 3, ktorá sa týka úpravy dispozičného a dopravného riešenia parkovacích miest v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec". K navrhovanej zmene predkladám nasledovné stanovisko:

Technické posúdenie náhrady:
Navrhovaným riešením je úprava trvalého dopravného značenia a reorganizácia rozmiestnenia parkovacích miest (v 1.PP a v celkovej situácii). Na základe predloženej projektovej dokumentácie (stupeň RPD a RP) a vyjadrenia HIP potvrdzujem, že navrhované riešenie:

- najefektívnejším spôsobom zabezpečuje organizáciu dopravy a plynulý pohyb osôb smerujúcich do a z polikliniky,
- plne zachováva celkový počet parkovacích miest definovaný v pôvodnom zámere,
- zodpovedá aktuálnym bezpečnostným, technickým a právnym normám.

Vplyv na cenu a harmonogram:
- Vplyv na cenu: Navrhovaná zmena je predkladaná ako bez vplyvu na cenu diela. Zhotoviteľ garantuje dodržanie rozpočtových nákladov v zmysle platnej Zmluvy o dielo bez nároku na navýšenie.
- Vplyv na harmonogram: Zmena nemá negatívny vplyv na lehotu výstavby.

Záver a odporúčanie:
Vzhľadom na potrebu zosúladenia projektu s platnými technickými normami pre parkovacie plochy a predloženie adekvátneho nového riešenia, ktoré zachováva kapacitu parkovania, TDI odporúča investorovi schváliť Ponuku na zmenu č. 3.
Zároveň odporúčam poskytnúť súčinnosť pri príprave a uzavretí príslušného písomného dodatku k Zmluve o dielo v zmysle ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní.

[redacted]

IČO: 36798002 • IČDPH: SK2022411237 • DIČ: 2022411237
cmarko@reallife-tdi.sk ,
Tel: 0917 796 757

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava/Slovensko

Označenie listu:	**L0005/BG/2026**
Stavba:	„Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec" (ďalej len „**Stavba**" alebo „**Dielo**");
Zmluva:	Zmluva o dielo č. 18/25/11 zo dňa 18.08.2025, s dátumom zverejnenia zo dňa 11.09.2025 a dátumom účinnosti zo dňa 12.09.2025; ID zmluvy: 11290439; URL: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11290439/?csrt=16839762818636380905 (ďalej len „**Zmluva**");
Objednávateľ:	Mesto Senec Mierové nám.8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 (ďalej len „**Objednávateľ**");
Zhotoviteľ:	STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.; so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 340 671(ďalej len „**Zhotoviteľ**");
Súvisiace články Zmluvy:	III, XV, XVII;
Súvisiaca Korešpondencia:	
Adresované:	Objednávateľovi a Technickému dozoru.

Dátum: 30.03.2026

Vec: **Sprievodný list k aktualizovanému Harmonogramu realizácie diela**

Vážený obchodný partner,

v nadväznosti na priebeh realizácie Diela si Vám týmto Zhotoviteľ dovoľuje predložiť aktualizovaný harmonogram realizácie prác, ktorý tvorí prílohu tohto listu.

Predložený harmonogram bol spracovaný v softvérovom prostredí MS Project, pričom vychádza z metodiky kritickej cesty (CPM). Harmonogram preto systematicky zohľadňuje jednotlivé činnosti, ich trvania, vzájomné väzby a identifikáciu kľúčových míľnikov, vrátane určenia kritických činností ovplyvňujúcich celkový termín dokončenia Diela.

Aktualizovaný harmonogram zároveň Zhotoviteľ predkladá za účelom zosúladenia jeho vecného a časového rámca so znením Zmluvy o dielo, najmä s ustanoveniami **Článku III – Miesto a čas plnenia**, konkrétne bodov 3.1 až 3.3, pričom maximálna lehota výstavby **24 mesiacov od odovzdania staveniska** zostáva zachovaná ako záväzný zmluvný parameter.

Potreba aktualizácie harmonogramu vznikla v dôsledku reálnych podmienok na stavenisku, ktoré nastali počas realizácie Diela a ktoré mali zásadný vplyv na technologickú nadväznosť a organizáciu stavebných procesov.
Zhotoviteľ bol z uvedených dôvodov nútený:

- upraviť pôvodne plánovanú postupnosť výstavby,
- rozdeliť realizáciu na samostatné etapy,
- zásadným spôsobom zmeniť organizáciu výstavby a výkon jednotlivých činností.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

Predložený harmonogram reflektuje aktuálny skutkový stav realizácie Diela, reálne technologické a organizačné možnosti Zhotoviteľa a súčasne rešpektuje zmluvné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti a s prihliadnutím na ustanovenia Článku XVII – Záverečné ustanovenia, najmä bod 17.4 Zmluvy, podľa ktorého je možné Zmluvu meniť výlučne formou písomných dodatkov, si Vás dovoľujeme požiadať o schválenie predloženého aktualizovaného harmonogramu a o poskytnutie potrebnej súčinnosti pri príprave a podpise dodatku k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude jeho zapracovanie a súčasné nahradenie pôvodného harmonogramu (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo) jeho aktualizovaným znením, ktoré bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

Uvedený postup je nevyhnutný pre zabezpečenie právnej istoty oboch Zmluvných strán, ako aj pre zosúladenie faktického priebehu realizácie Diela so zmluvnou dokumentáciou.

Prílohy:

1. – Aktualizovaný Harmonogram realizácie Diela

[redacted]

stavbyvedúci
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava/Slovensko
www.strabag-pozemne.sk

Tel. +421 2 3262-1111
Fax +421 2 3262-3341
strabag-pozemne@strabag.com


Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157173/B,
IČO: 53 340 671, IČ DPH: SK2121451299

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava

ID	Názov úlohy	Trvanie v Kalendárnych dňoch
1	**Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**	**730 dys**
2	**Predrealizačná fáza**	**171 dys**
3	Projektové práce	171 dys
4	**Realizačná fáza**	**730 dys**
5	**Lehota výstavby (24 mesiacov od odovzdania staveniska)**	730 dys
6	**Prevzatie staveniska**	**0 dys**
7	**Zariadenie staveniska, mobilizácia pracovných kapacít**	**14 dys**
8	**Príparava územia a búracie práce**	**39 dys**
9	**Výrub drevín**	**5 dys**
10	**Prístavba polikliniky - zakladanie a podzemná garáž**	**676 dys**
11	Zemné práce	214 dys
12	Zakladanie	153 dys
13	Nosná konštrukcia	150 dys
14	HSV práce a dodávky	123 dys
15	Technické zariadenia budov-rozvody	154 dys
16	PSV práce a dodávky	78 dys
17	Dokončovacie práce	264 dys
18	**Prístavba polikliniky - novostavba a dostavba**	**431 dys**
19	Nosná konštrukcia	122 dys
20	HSV práce a dodávky	147 dys
21	Technické zariadenia budov-rozvody	242 dys
22	PSV práce a dodávky	156 dys
23	Dokončovacie práce	97 dys
24	**Odpadové hospodárstvo**	151 dys
25	**Komunikácie a spevnené plochy**	118 dys
26	**Splašková kanalizácia**	102 dys
27	**Dažďová kanalizácia**	102 dys
28	**Tuková kanalizácia**	188 dys
29	**Vodovod**	188 dys
30	**Prípojka NN a rozvody**	188 dys
31	**VN prípojka**	**188 dys**
32	**Prípojka slaboprúdov a rozvody**	**188 dys**
33	**Prípojka plynu**	**188 dys**
34	**Sadové úpravy**	**45 dys**
35	**Protokolárne odovzdanie diela**	**0 dys**

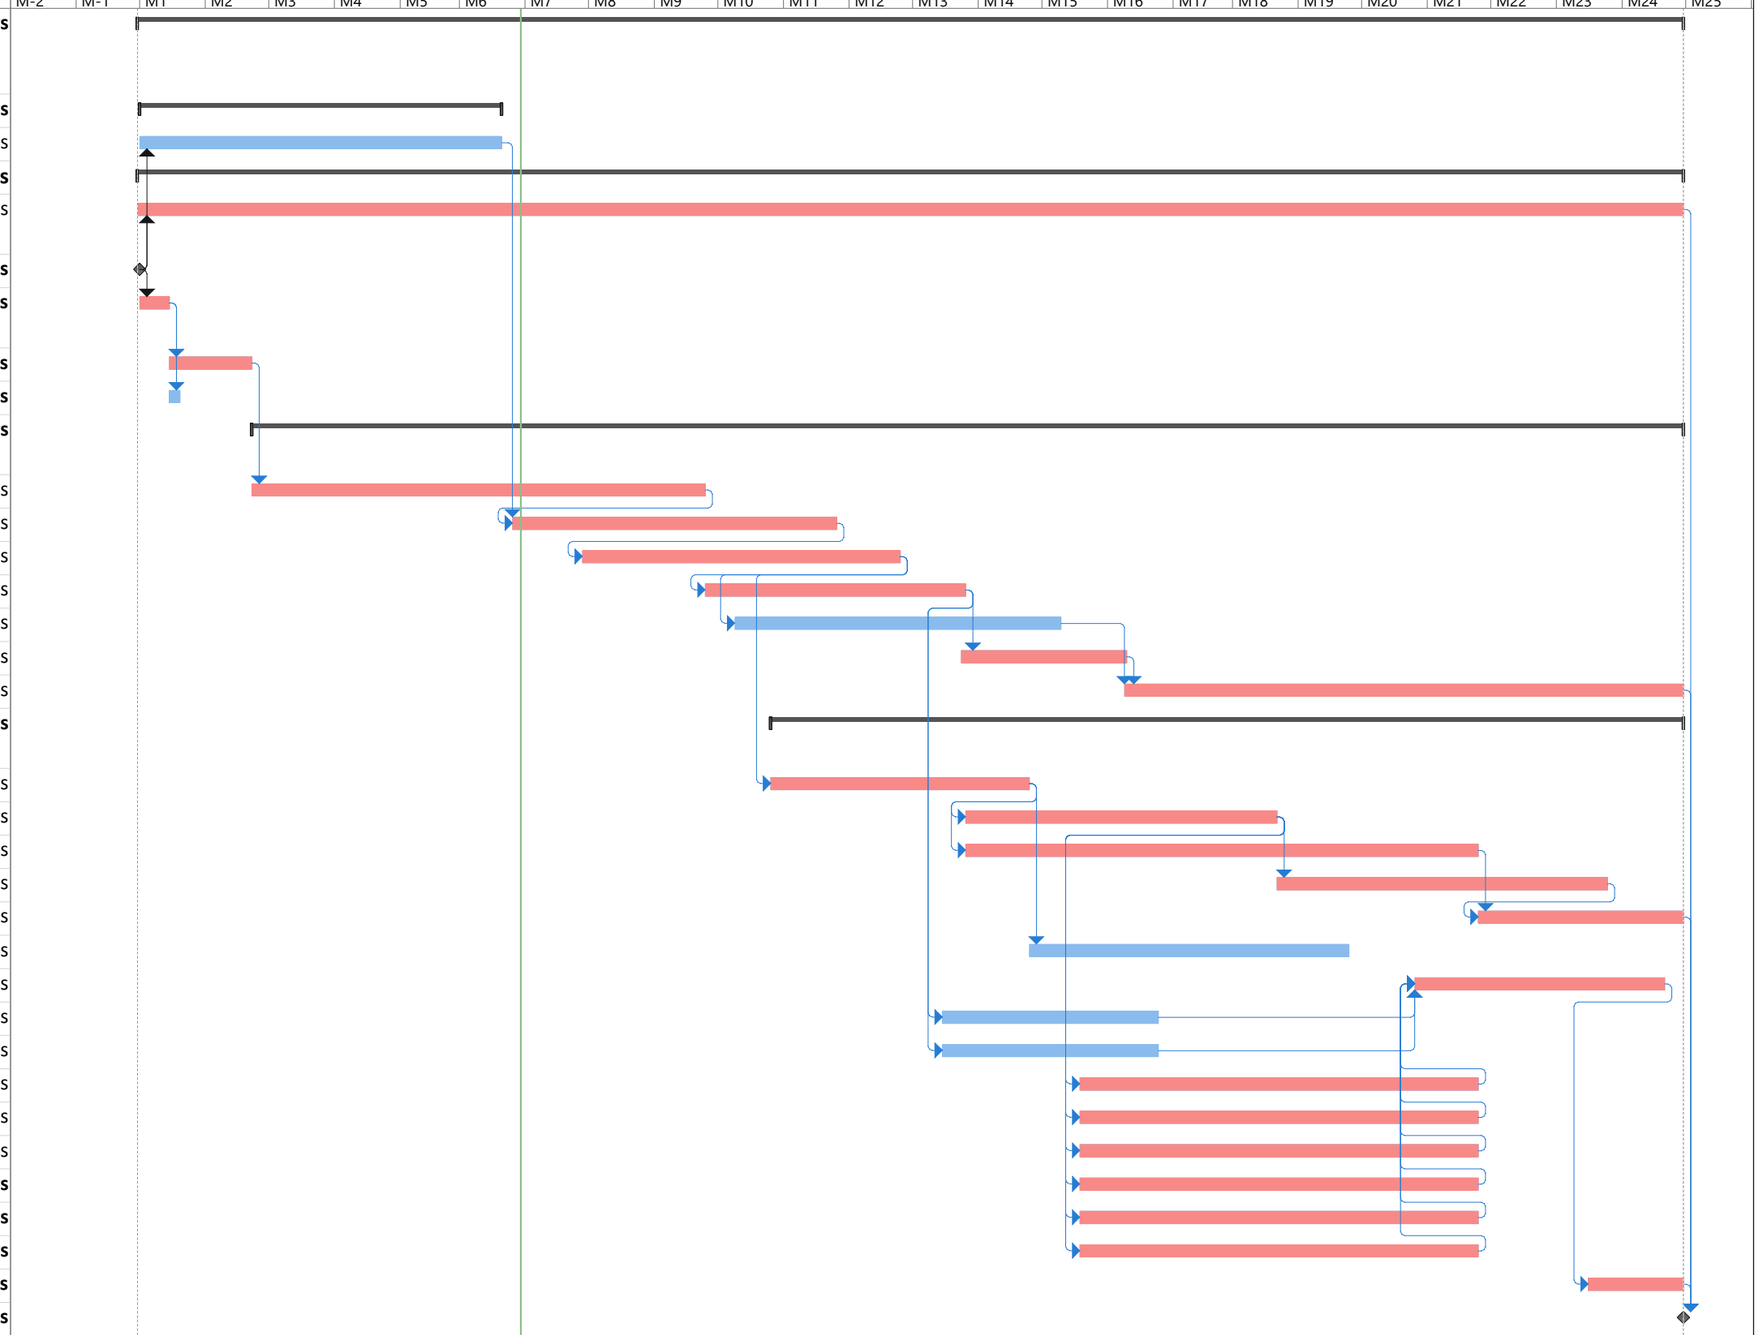

Projekt: Aktualizovaný Harmonogram realizácie Diela
Dátum: 30.3.26 15:33

Critical Split	Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník	Critical		
Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termín			
Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh			
Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh			

RealLife

Real Life, s.r.o. Na Pažiti 835/1, 911 05 Trenčín

Mesto Senec
Mierové Námestie č. 8
903 01 Senec

Vec: Stanovisko TDI k aktualizovanému Harmonogramu realizácie diela – Stavba: „Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec“

Vážený investor,
ako technický dozor investora som posúdil aktualizovaný Harmonogram realizácie diela (z dňa 30.03.2026), ktorý predložil zhotoviteľ STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. v nadväznosti na prípravu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/25/11.

K predloženému harmonogramu predkladám nasledovné stanovisko:

1. Posúdenie lehoty výstavby Aktualizovaný harmonogram zachováva celkovú zmluvnú lehotu výstavby v trvaní 730 kalendárnych dní (24 mesiacov) od odovzdania staveniska. Z pohľadu investora nedochádza k predĺženiu konečného termínu ukončenia diela, čo je v súlade so záväznými zmluvnými parametrami.

2. Odôvodnenie zmien v technologickej postupnosti Zhotoviteľ v aktualizácii reflektuje reálne podmienky na stavenisku, ktoré si vyžiadali úpravu organizácie výstavby. Navrhované úpravy zahŕňajú:

Rozdelenie realizácie na samostatné etapy, čím sa optimalizuje výkon prác na prístavbe a zakladaní objektu.

Záver a odporúčanie: Predložený harmonogram považujem za technicky opodstatnený a reálny vzhľadom na súčasný skutkový stav realizácie diela. Zabezpečuje potrebné zosúladenie faktického priebehu výstavby so zmluvnou dokumentáciou.

TDI odporúča investorovi schváliť tento aktualizovaný harmonogram a zapracovať ho formou písomného dodatku k Zmluve o dielo ako novú Prílohu č. 2.

[redacted]
Technický dozor investora
Ľubor Cmarko

IČO: 36798002 ▪ IČDPH: SK2022411237 ▪ DIČ: 2022411237
cmarko@reallife-tdi.sk ,
Tel: 0917 796 757
